


MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19037

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO


TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-037
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS
 LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
 EJERCICIO FISCAL 2019

LOCALIDAD: KALTENANGO
 UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
 FECHA DE INICIO: 05 JUN 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 JUL 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186-19037
 MONTO ORIGINAL: \$1,980,000.00
 FECHA DE FIRMA: 04 JUN 2019
 FECHA VENCE: 29 JUL 2019
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.

TELEFONO:
 R. F. C.: SCO0503184K6
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,980,000.00
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 19A21189
 CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$198,000.00
 FIANZA ANTICIPO: 19A21186
 CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.
 FECHA FIANZA: 04 JUN 2019
 MONTO FIANZA: \$549,000.00
 FIANZA VICIOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO




OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF	1,980,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,980,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.241	4,774.56	4,774.56 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		4,774.56	4,774.56
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.329	46,106.98	46,106.98 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		46,106.98	46,106.98
003	EXCAVACION EN CAJA TODAS LAS ZONAS	26.334	521,404.08	521,404.08 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		521,404.08	521,404.08
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.927	57,949.93	57,949.93 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		57,949.93	57,949.93
005	ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. KM.SUB	1.557	30,837.15	30,837.15 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		30,837.15	30,837.15
006	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.181	3,574.94	3,574.94 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		3,574.94	3,574.94
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.882	17,458.00	17,458.00 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		17,458.00	17,458.00
008	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL Q CUMPLA N	4.715	93,354.25	93,354.25 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		93,354.25	93,354.25
009	SUB-BASE HIDRAU. CONMATERIAL Q CUMPLA N	3.935	77,914.89	77,914.89 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		77,914.89	77,914.89
010	ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. 1KM	1.290	25,542.10	25,542.10 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		25,542.10	25,542.10
011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL KMSUB	11.633	230,343.14	230,343.14 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		230,343.14	230,343.14
012	ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MA	0.683	13,520.69	13,520.69 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		13,520.69	13,520.69
013	SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA,	3.171	62,787.47	62,787.47 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		62,787.47	62,787.47
014	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	31.630	626,283.42	626,283.42 100.000 100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		626,283.42	626,283.42
015	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV.	0.770	15,244.49	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		15,244.49	0.00
016	CALAFATEO DE GRIETAS	0.257	5,091.24	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		5,091.24	0.00
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	1.221	24,177.30	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		24,177.30	0.00
018	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL	0.228	4,519.77	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		4,519.77	0.00
019	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.432	8,550.36	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		8,550.36	0.00
020	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150	4.823	95,503.73	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		95,503.73	0.00
021	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN A.	0.230	4,560.25	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		4,560.25	0.00
022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.531	10,501.26	0.00 0.000 0.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		10,501.26	0.00

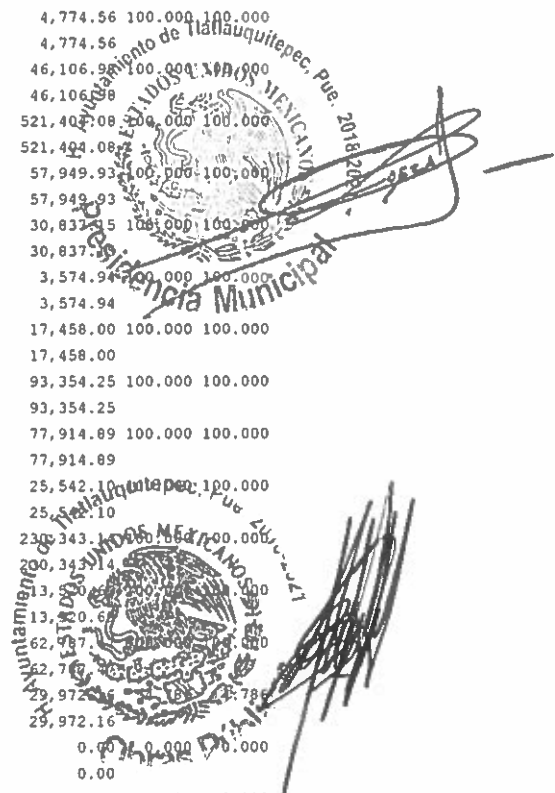

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO




OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

TOTAL 100.000 1,980,000.00 1,215,540.34 61.391 61.392

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	61.392	0.000	61.392
FINANCIERO:	1,215,540.34 61.391	0.00 0.000	1,215,540.34 61.391

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

04 JUL 2019: REPORTE NO.01
 ESTIMACION 1
 CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO
 AL 04 DE JULIO DE 2019



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE



		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 JUL 2019	D07MCO046	4,774.56		4,774.56
	1.2.3.5.4			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
	186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO			
	1RA ESTIMACION 186/19037			
Requisición:	06MCO0018			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES			
	6.01			
	RECURSOS ESTATALES FAFEF			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA			
	3703			
Componente:	URBANIZACIÓN			
	01			
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA			
	01			
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA			
	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	186/19037			
Acreeedor:	0002094			
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV			
Contrato:	186-19037			
04 JUL 2019	D07MCO046		50,881.54	
	1.2.3.5.4			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
	186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO			
	1RA ESTIMACION 186/19037			
Requisición:	06MCO0018			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS			
	6.01			
	RECURSOS ESTATALES FAFEF			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA			
	3703			
Componente:	URBANIZACIÓN			
	01			
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA			
	01			
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA			
	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	186/19037			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

<p>Acreeedor: 0002094 Contrato: 186-19037 04 JUL 2019 D07MCV0046</p>	<p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 1.2.3.5.4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA ESTIMACION 186/19037</p>	<p>521,404.00</p>	<p>572,285.62</p>
<p>Requisición: 06MCV00018 Concepto: 003 Fuente financ.: 6.01 Unidad admin.: 03 Programa: 3703 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 221 C.O.G.: 6.1.4 Ficha por pagar: 186/19037 Acreeedor: 0002094 Contrato: 186-19037 04 JUL 2019 D07MCV0046</p>	<p>EXCAVACION EN CAJA TODAS LAS ZONAS RECURSOS ESTATALES FAFEF OBRA PUBLICA URBANIZACION INFRAESTRUCTURA ECONOMICA OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANIZACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p>	<p>57,949.93</p>	<p>630,235.55</p>




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

<p>04 JUL 2019</p> <p>Contrato: 186-19037</p> <p>D07MVCV0046</p>	<p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</p> <p>186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</p> <p>1RA ESTIMACION 186/19037</p> <p>Requisición: 06MVCV00018</p> <p>Concepto: 005</p> <p>ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. KM.SUB</p> <p>Fuente financ.: 6.01</p> <p>RECURSOS ESTATALES FAFEF</p> <p>Unidad admin.: 03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 3703</p> <p>URBANIZACION</p> <p>Componente: 01</p> <p>INFRAESTRUCTURA ECONOMICA</p> <p>Actividad: 01</p> <p>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Función: 221</p> <p>URBANIZACION</p> <p>C.O.G.: 6.1.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 186/19037</p> <p>Acreeedor: 0002094</p> <p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p>	<p>30,837.15</p> <p>661,072.70</p>
<p>04 JUL 2019</p> <p>Contrato: 186-19037</p> <p>D07MVCV0046</p>	<p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</p> <p>186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</p> <p>1RA ESTIMACION 186/19037</p> <p>Requisición: 06MVCV00018</p> <p>Concepto: 006</p> <p>ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO</p> <p>Fuente financ.: 6.01</p> <p>RECURSOS ESTATALES FAFEF</p> <p>Unidad admin.: 03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 3703</p> <p>URBANIZACION</p> <p>Componente: 01</p> <p>INFRAESTRUCTURA ECONOMICA</p> <p>Actividad: 01</p> <p>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Función: 221</p> <p>URBANIZACION</p> <p>C.O.G.: 6.1.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 186/19037</p> <p>Acreeedor: 0002094</p> <p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p>	<p>3,574.94</p> <p>664,647.64</p>
<p>04 JUL 2019</p> <p>Contrato: 186-19037</p> <p>D07MVCV0046</p>	<p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</p> <p>186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</p> <p>1RA ESTIMACION 186/19037</p> <p>Requisición: 06MVCV00018</p> <p>Concepto: 006</p> <p>ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO</p> <p>Fuente financ.: 6.01</p> <p>RECURSOS ESTATALES FAFEF</p> <p>Unidad admin.: 03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 3703</p> <p>URBANIZACION</p> <p>Componente: 01</p> <p>INFRAESTRUCTURA ECONOMICA</p> <p>Actividad: 01</p> <p>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Función: 221</p> <p>URBANIZACION</p> <p>C.O.G.: 6.1.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 186/19037</p> <p>Acreeedor: 0002094</p> <p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p>	<p>17,458.00</p> <p>682,105.64</p>



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MVC00018		
Concepto:	007		
Fuente financ.:	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 6.01		
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES FAFEF 03		
Programa:	OBRA PUBLICA 3703		
Componente:	URBANIZACIÓN 01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 186/19037		
Acreeedor:	0002094		
Contrato:	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 186-19037		
04 JUL 2019 D07MVC0046	1.2.3.5.4	93,354.25	775,459.89
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MVC00018		
Concepto:	008		
Fuente financ.:	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL O CUMPLA N 6.01		
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES FAFEF 03		
Programa:	OBRA PUBLICA 3703		
Componente:	URBANIZACIÓN 01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 186/19037		
Acreeedor:	0002094		
Contrato:	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 186-19037		
04 JUL 2019 D07MVC0046	1.2.3.5.4	77,914.89	853,374.78
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 IRA ESTIMACION 186/19037
 Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 009
 Fuente financ.: 6.01
 Unidad admin.: 03
 Programa: 3703
 Componente: 01
 Actividad: 01
 Función: 221
 C.O.G.: 6.1.4
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 Contrato: 186-19037
 04 JUL 2019 D07MCV0046


1.2.3.5.4
 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE
 OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 IRA ESTIMACION 186/19037

Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 010
 Fuente financ.: 6.01
 Unidad admin.: 03
 Programa: 3703
 Componente: 01
 Actividad: 01
 Función: 221
 C.O.G.: 6.1.4
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 Contrato: 186-19037
 04 JUL 2019 D07MCV0046

1.2.3.5.4
 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE
 OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO



878,916.88



230,343.14


1,109,260.02

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	HIDRAULICO		
	IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MVC00018		
Concepto:	011		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL KMSUB		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MVC0046	1.2.3.5.4	13,520.69	1,122,780.71
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MVC00018		
Concepto:	012		
	ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MA		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MVC0046	1.2.3.5.4	62,787.47	1,185,568.18
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	IRA ESTIMACION 186/19037		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Requisición:	06MCV00018		
Concepto:	013		
Fuente financ.:	6.01		
Unidad admin.:	03		
Programa:	3703		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreeedor:	0002094		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MVC0046	1.2.3.5.4	29,972.16	1,215,540.34
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		
	IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MCV00018		
Concepto:	014		
Fuente financ.:	6.01		
Unidad admin.:	03		
Programa:	3703		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreeedor:	0002094		
Contrato:	186-19037		
SUMA PERIODO:	1,215,540.34	0.00 1,215,540.34
SALDO FINAL:	1,215,540.34	0.00 1,215,540.34



[Handwritten signatures and scribbles over the official stamps]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 186/19037
NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TM/2019-037
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS
LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
EJERCICIO FISCAL 2019

LOCALIDAD: XALTENANGO
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 05 JUN 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 JUL 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 186-19037
MONTO ORIGINAL: \$1,980,000.00
FECHA DE FIRMA: 04 JUN 2019
FECHA VENCE: 29 JUL 2019
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.: SCO0503184K6
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,980,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 19A21189

CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$198,000.00

FIANZA ANTICIPO: 19A21186
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.
FECHA FIANZA: 04 JUN 2019
MONTO FIANZA: \$549,000.00
2132240-0000

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.
FECHA FIANZA: 29 JUL 2019
MONTO FIANZA: \$198,000.00



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEB
2018 - 2021



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF	1,980,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,980,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.241	4,774.56	4,774.56	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		4,774.56	4,774.56		
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.329	46,106.98	46,106.98	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		46,106.98	46,106.98		
003	EXCAVACION EN CAJA TODAS LAS ZONAS	26.334	521,404.08	521,404.08	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		521,404.08	521,404.08		
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO	2.927	57,949.93	57,949.93	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		57,949.93	57,949.93		
005	ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. KM.SUB	1.557	30,837.15	30,837.15	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		30,837.15	30,837.15		
006	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO	0.181	3,574.94	3,574.94	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		3,574.94	3,574.94		
007	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	0.882	17,458.00	17,458.00	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		17,458.00	17,458.00		
008	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL Q CUMPLA N	4.715	93,354.25	93,354.25	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		93,354.25	93,354.25		
009	SUB-BASE HIDRAU. CONMATERIAL Q CUMPLA N	3.935	77,914.89	77,914.89	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		77,914.89	77,914.89		
010	ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. 1KM	1.290	25,542.10	25,542.10	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		25,542.10	25,542.10		
011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL KMSUB	11.633	230,343.14	230,343.14	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		230,343.14	230,343.14		
012	ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MA	0.683	13,520.69	13,520.69	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		13,520.69	13,520.69		
013	SOBRE ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA,	3.171	62,787.47	62,787.47	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		62,787.47	62,787.47		
014	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15	31.630	626,283.42	626,283.42	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		626,283.42	626,283.42		
015	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV.	0.770	15,244.49	15,244.49	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		15,244.49	15,244.49		
016	CALAFATEO DE GRIETAS	0.257	5,091.24	5,091.24	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		5,091.24	5,091.24		
017	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS	1.221	24,177.30	24,177.30	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		24,177.30	24,177.30		
018	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL	0.228	4,519.77	4,519.77	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		4,519.77	4,519.77		
019	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.432	8,550.36	8,550.36	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		8,550.36	8,550.36		
020	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150	4.823	95,503.73	95,503.73	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		95,503.73	95,503.73		
021	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN A.	0.230	4,560.25	4,560.25	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		4,560.25	4,560.25		
022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.531	10,501.26	10,501.26	100.000	100.000
6.01	RECURSOS ESTATALES FAFEF		10,501.26	10,501.26		

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla, 2018-2021
 Presidente Municipal

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

TOTAL 100.000 1,980,000.00 1,980,000.00 100.000 100.000



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUE.
 2018 - 2021

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,980,000.00 100.000	0.00 0.000	1,980,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

- 04 JUL 2019: REPORTE NO.01
 ESTIMACION 1
 CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JUNIO
 AL 04 DE JULIO DE 2019
- 29 JUL 2019: REPORTE NO. 02
 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 29 DE J
 DE 2019

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 JUL 2019 D07MCV0046	1.2.3.5.4	4,774.56		4,774.56
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA ESTIMACION 186/19037 Requisición: 06MCV00018 Concepto: 001 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES FAFEF Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 3703 URBANIZACIÓN Componente: 01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Actividad: 01 OBRA DE INFRAESTRUCTURA Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 186/19037 Acreedor: 0002094 SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV Contrato: 186-19037			
04 JUL 2019 D07MCV0046	1.2.3.5.4	46,106.98		50,881.54
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA ESTIMACION 186/19037 Requisición: 06MCV00018 Concepto: 002 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICO Fuente financ.: 6.01 RECURSOS ESTATALES FAFEF Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 3703 URBANIZACIÓN Componente: 01 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Actividad: 01 OBRA DE INFRAESTRUCTURA Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Ficha por pagar: 186/19037			

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidencia Municipal

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

RFC: MTP930215QP7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

<p>Acreeedor: 0002094</p> <p>Contrato: 186-19037</p> <p>04 JUL 2019 D07MCV0046</p>	<p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p> <p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</p> <p>186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</p> <p>1RA ESTIMACION 186/19037</p> <p>Requisición: 06MCV00018</p> <p>Concepto: 003</p> <p>Excavacion en caja todas las zonas</p> <p>Fuente financ.: 6.01</p> <p>RECURSOS ESTATALES FAFEF</p> <p>Unidad admin.: 03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 3703</p> <p>URBANIZACION</p> <p>Componente: 01</p> <p>INFRAESTRUCTURA ECONOMICA</p> <p>Actividad: 01</p> <p>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Función: 221</p> <p>URBANIZACION</p> <p>C.O.G.: 6.1.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 186/19037</p> <p>Acreeedor: 0002094</p> <p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p> <p>Contrato: 186-19037</p> <p>04 JUL 2019 D07MCV0046</p>	<p>521,404.08</p> <p>572,285.62</p>
<p>Ficha por pagar: 186/19037</p> <p>Acreeedor: 0002094</p> <p>Contrato: 186-19037</p> <p>04 JUL 2019 D07MCV0046</p>	<p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p> <p>1.2.3.5.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</p> <p>186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</p> <p>1RA ESTIMACION 186/19037</p> <p>Requisición: 06MCV00018</p> <p>Concepto: 004</p> <p>Acarreo en camion de material</p> <p>Fuente financ.: 6.01</p> <p>RECURSOS ESTATALES FAFEF</p> <p>Unidad admin.: 03</p> <p>OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 3703</p> <p>URBANIZACION</p> <p>Componente: 01</p> <p>INFRAESTRUCTURA ECONOMICA</p> <p>Actividad: 01</p> <p>OBRA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Función: 221</p> <p>URBANIZACION</p> <p>C.O.G.: 6.1.4</p> <p>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</p> <p>Ficha por pagar: 186/19037</p> <p>Acreeedor: 0002094</p> <p>SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p>	<p>57,949.93</p> <p>630,235.55</p>




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2020 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MCO046	1.2.3.5.4	30,837.15	661,072.70
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		
	IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MCO0018		
Concepto:	005		
	ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. KM.SUB		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MCO046	1.2.3.5.4	3,574.94	664,647.64
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		
	IRA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MCO0018		
Concepto:	006		
	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MCO046	1.2.3.5.4	17,458.00	682,105.64



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 1RA ESTIMACION 186/19037

Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 007
 Fuente financ.: 6.01
 Unidad admin.: 03
 Programa: 3703
 Componente: 01
 Actividad: 01
 Función: 221
 C.O.G.: 6.1.4
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 Contrato: 186-19037

04 JUL 2019 D07MCV0046

93,354.25

775,459.89

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 1RA ESTIMACION 186/19037

Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 008
 Fuente financ.: 6.01
 Unidad admin.: 03
 Programa: 3703
 Componente: 01
 Actividad: 01
 Función: 221
 C.O.G.: 6.1.4
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 Contrato: 186-19037

04 JUL 2019 D07MCV0046

77,914.89

853,374.78

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 1RA ESTIMACION 186/19037
 Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 009
 Fuente financ.: SUB-BASE HIDRAU. CONMATERIAL Q CUMPLA N 6.01
 Unidad admin.: RECURSOS ESTATALES FAFEF 03
 Programa: OBRA PUBLICA 3703
 Componente: URBANIZACIÓN 01
 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01
 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221
 C.O.G.: URBANIZACIÓN 6.1.4

Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 Contrato: SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 186-19037
 04 JUL 2019 D07MVCV0046 1.2.3.5.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 1RA ESTIMACION 186/19037

Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 010
 Fuente financ.: ACARREO EN CAMION MATERIAL MIXTO. 1KM 6.01
 Unidad admin.: RECURSOS ESTATALES FAFEF 03


Programa: OBRA PUBLICA 3703
 Componente: URBANIZACIÓN 01
 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01
 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221
 C.O.G.: URBANIZACIÓN 6.1.4

Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 Contrato: SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 186-19037
 04 JUL 2019 D07MVCV0046 1.2.3.5.4

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



678,916.00



230,343.14

1,109,260.02

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO			
	HIDRAULICO		
	1RA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MCV00018		
Concepto:	011		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL KMSUB		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreeedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MCV0046	1.2.3.5.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	1RA ESTIMACION 186/19037		
Requisición:	06MCV00018		
Concepto:	012		
	ACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MA		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreeedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
04 JUL 2019 D07MCV0046	1.2.3.5.4	62,787.47	1,185,568.18
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF 1RA ESTIMACION		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	1RA ESTIMACION 186/19037		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO





TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021



Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 013
 Fuente financ.: 6.01
 Recursos ESTATALES FAFEF
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 3703
 URBANIZACIÓN
 Componente: 01
 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
 Actividad: 01
 OBRA DE INFRAESTRUCTURA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 Contrato: 186-19037
 04 JUL 2019 D07MCV0046 1.2.3.5.4 29,972.16 1,215,540.34

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF IRA ESTIMACION
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 IRA ESTIMACION 186/19037



Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 014
 Fuente financ.: 6.01
 Recursos ESTATALES FAFEF
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 3703
 URBANIZACIÓN
 Componente: 01
 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
 Actividad: 01
 OBRA DE INFRAESTRUCTURA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 Contrato: 186-19037
 29 JUL 2019 D07MCV0055 1.2.3.5.4 1,811,851.60



Requisición: 06MCV00018
 Concepto: 014


MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO




TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEB.
 2018 - 2021

[Handwritten signature]

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO			
Fuente financ.:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15		
	6.01		
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	3703		
Componente:	URBANIZACIÓN		
	01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
	01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
	6.1.4		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
Acreeedor:	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	186/19037		
	0002094		
Contrato:	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
	186-19037		
29 JUL 2019 D07MCO055	1.2.3.5.4	15,244.49	1,827,096.09
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQU		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		
Requisición:	06MCO0018		
Concepto:	015		
Fuente financ.:	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAV.		
	6.01		
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	3703		
Componente:	URBANIZACIÓN		
	01		
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		
	01		
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
	6.1.4		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
Acreeedor:	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	186/19037		
	0002094		
Contrato:	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
	186-19037		
29 JUL 2019 D07MCO055	1.2.3.5.4	5,091.24	1,832,187.33
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQU		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		
Requisición:	06MCO0018		
Concepto:	016		
Fuente financ.:	CALAFATEO DE GRIETAS		
	6.01		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

Unidad admin.: RECURSOS ESTATALES FAFEF
 03
 Programa: OBRA PUBLICA
 3703
 Componente: URBANIZACIÓN
 01
 Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
 01
 Función: OBRA DE INFRAESTRUCTURA
 221
 C.O.G.: URBANIZACIÓN
 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 Contrato: 186-19037
 29 JUL 2019 D07MCO055 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO
 Requisición: 06MCO0018
 Concepto: 017
 ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS
 Fuente financ.: 6.01
 RECURSOS ESTATALES FAFEF
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 3703
 URBANIZACIÓN
 Componente: 01
 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
 Actividad: 01
 OBRA DE INFRAESTRUCTURA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 Contrato: 186-19037
 29 JUL 2019 D07MCO055 1.2.3.5.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
 HIDRAULICO
 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO
 Requisición: 06MCO0018
 Concepto: 018
 CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL
 Fuente financ.: 6.01
 RECURSOS ESTATALES FAFEF
 Unidad admin.: 03



1,856,364.63



4,519.77

1,860,884.40


MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEB.
 2018 - 2021

Programa:	OBRA PUBLICA 3703	
Componente:	URBANIZACIÓN 01	
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01	
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221	
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4	
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Acreeador:	186/19037 0002094	
Contrato:	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 186-19037	
29 JUL 2019 D07MVCV0055	1.2.3.5.4	1,869,434.76
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
	186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQU CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
Requisición:	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 06MVCV00018	
Concepto:	019	
Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA 6.01	
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES FAFEF 03	
Programa:	OBRA PUBLICA 3703	
Componente:	URBANIZACIÓN 01	
Actividad:	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 01	
Función:	OBRA DE INFRAESTRUCTURA 221	
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4	
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Acreeador:	186/19037 0002094	
Contrato:	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV 186-19037	
29 JUL 2019 D07MVCV0055	1.2.3.5.4	1,964,938.49
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
	186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQU CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
Requisición:	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO 06MVCV00018	
Concepto:	020	
Fuente financ.:	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 6.01	
Unidad admin.:	RECURSOS ESTATALES FAFEF 03	
Programa:	OBRA PUBLICA 3703	




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreeedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
29 JUL 2019 D07MVC0055	1.2.3.5.4	4,560.25	1,969,498.74
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQU		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		
Requisición:	06MVC00018		
Concepto:	021		
	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN A.		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		
	INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		
Actividad:	01		
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	186/19037		
Acreeedor:	0002094		
	SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV		
Contrato:	186-19037		
29 JUL 2019 D07MVC0055	1.2.3.5.4	10,501.26	1,980,000.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	186/19037 FAFEF 2DA ESTIMACION Y FINIQU		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO		
	HIDRAULICO		
	2DA ESTIMACION Y FINIQUITO		
Requisición:	06MVC00018		
Concepto:	022		
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO		
Fuente financ.:	6.01		
	RECURSOS ESTATALES FAFEF		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	3703		
	URBANIZACIÓN		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. 186/19037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
 01
 OBRA DE INFRAESTRUCTURA
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 186/19037
 Acreedor: 0002094
 SALIDA CONSTRUCCIONES SA DE CV
 Contrato: 186-19037

SUMA PERIODO:.....	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
SALDO FINAL:.....	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
