

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 21-2124/007

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI  
TEPEC, PUEBLA, LOCALIDAD EL PARAISO EN L

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2021-12/007  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA  
EJERCICIO FISCAL 2021

LOCALIDAD: EL PARAISO  
UBICACIÓN: CALLE JILIAPA ENTRE LAS CALLES 12 DE OCT  
FECHA DE INICIO: 08 DIC 2021  
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 ENE 2022


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 21-2124/007  
MONTO ORIGINAL: \$544,827.73  
FECHA DE FIRMA: 08 DIC 2021  
FECHA VENGE: 08 ENE 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ  
DOMICILIO: QUINTANA ROO  
No. Exterior: 905 No. Interior:  
Colonia: C. P.: 93420  
Municipio: PAPANTLA Entidad Fed.: VERACRUZ

TELEFONO:  
R. F. C.: MAHL560902TLA  
CONTACTO:


IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$544,827.73  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2148142  
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE  
FECHA FIANZA: 08 DIC 2021  
MONTO FIANZA: \$54,482.77

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2150104  
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE  
FECHA FIANZA: 08 ENE 2022  
MONTO FIANZA: \$54,482.77



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	544,827.73
TOTAL ASIGNADO.....		544,827.73

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.916	4,991.72	4,991.72	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,991.72	4,991.72		
002	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.207	6,578.24	6,578.24	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,578.24	6,578.24		
003	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.755	4,111.68	4,111.68	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,111.68	4,111.68		
004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.676	9,130.51	9,130.51	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,130.51	9,130.51		
005	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.284	1,546.72	1,546.72	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,546.72	1,546.72		
006	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP	6.375	34,731.56	34,731.56	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		34,731.56	34,731.56		
007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% P	0.533	2,906.57	2,906.57	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,906.57	2,906.57		
008	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.536	8,366.48	8,366.48	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		8,366.48	8,366.48		
009	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.425	2,313.30	2,313.30	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,313.30	2,313.30		
010	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.943	5,136.98	5,136.98	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,136.98	5,136.98		
011	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	15.173	82,666.82	82,666.82	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		82,666.82	82,666.82		
012	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.213	33,850.06	33,850.06	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		33,850.06	33,850.06		
013	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	0.573	3,122.66	3,122.66	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,122.66	3,122.66		
014	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6	4.223	23,006.59	23,006.59	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		23,006.59	23,006.59		
015	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	37.484	204,224.53	204,224.53	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		204,224.53	204,224.53		
016	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.975	10,760.37	10,760.37	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,760.37	10,760.37		
017	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.804	9,827.80	9,827.80	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,827.80	9,827.80		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA	0.882	4,806.13	4,806.13	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,806.13	4,806.13		
019	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PA	0.616	3,357.92	3,357.92	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,357.92	3,357.92		
020	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.071	384.93	384.93	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		384.93	384.93		
021	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE API	0.299	1,627.75	1,627.75	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,627.75	1,627.75		
022	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	0.202	1,100.81	1,100.81	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,100.81	1,100.81		
023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.444	2,416.84	2,416.84	100.000	100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO




OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,416.84	2,416.84		
024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.029	156.60	156.60	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		156.60	156.60		
025	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET	1.090	5,940.19	5,940.19	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,940.19	5,940.19		
026	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	3.924	21,381.14	21,381.14	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,381.14	21,381.14		
027	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.477	2,598.67	2,598.67	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		2,598.67	2,598.67		
028	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI	0.556	3,027.41	3,027.41	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,027.41	3,027.41		
029	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.671	3,657.11	3,657.11	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,657.11	3,657.11		
030	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.197	1,073.88	1,073.88	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,073.88	1,073.88		
031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.366	1,993.10	1,993.10	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,993.10	1,993.10		
032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELEC	7.345	40,017.02	40,017.02	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		40,017.02	40,017.02		
033	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.736	4,015.64	4,015.64	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,015.64	4,015.64		
TOTAL			100.000	544,827.73	544,827.73	100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	544,827.73 100.000	0.00 0.000	544,827.73 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 ENE 2022: REPORTE NO. 01  
 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE DICIEMR  
 AL 08 DE ENERO DE 2022

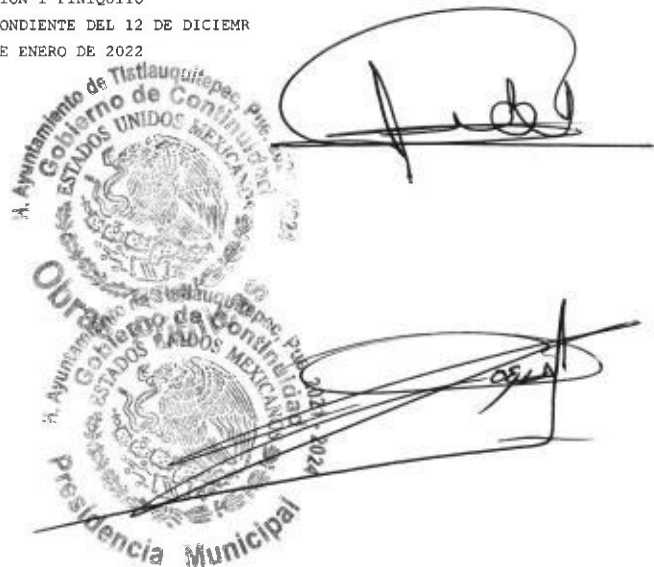


MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE


	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
08 ENE 2022 D01MCV0024	4,991.72		4,991.72
1.2.3.5.4.1			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO			
Requisición:			
Concepto:			
Fuente financ.:			
Unidad admin.:			
Programa:			
Componente:			
Actividad:			
Función:			
C.O.G.:			
Ficha por pagar:			
Acreedor:			
Contrato:			
08 ENE 2022 D01MCV0024	6,578.24		11,569.96
1.2.3.5.4.1			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA			
Requisición:			
Concepto:			
Fuente financ.:			
Unidad admin.:			
Programa:			
Componente:			
Actividad:			
Función:			
C.O.G.:			
Ficha por pagar:			
Acreedor:			
Contrato:			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	4,111.68	15,681.64
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	003		
	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	9,130.51	24,812.15
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	004		
	ACARRÉO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022	D01MCV0024	1,546.72	26,356.87
	1.2.3.5.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	005		
	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022	D01MCV0024	34,731.56	61,090.43
	1.2.3.5.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	006		
	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAP		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeador:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	2,906.57	63,997.00
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	007		
Concepto:	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% P		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeador:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	8,366.48	72,363.48
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA

Requisición: 01MCV00030  
 Concepto: 008  
 Fuente financ.: COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00030  
 Acreedor: 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ

Contrato: 21-2124/007  
 08 ENE 2022 D01MCV0024 1.2.3.5.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA

Requisición: 01MCV00030  
 Concepto: 009  
 Fuente financ.: CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00030



2,313.30 74,676.78





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	5,136.98	79,813.76
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	010		
Concepto:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	82,666.82	162,480.58
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	011		
Concepto:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00030  
 Acreedor: 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ

Contrato: 21-2124/007  
 08 ENE 2022 D01MCV0024 1.2.3.5.4.1 33,850.06 196,330.64

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030

Requisición:  
 Concepto: 012  
 BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00030  
 Acreedor: 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ

Contrato: 21-2124/007  
 08 ENE 2022 D01MCV0024 1.2.3.5.4.1 3,122.66 199,453.30

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030



Requisición:  
 Concepto: 013  
 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM


Componente: 01



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreedor:	0004653 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	23,006.59	222,459.89
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	014		
Concepto:	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreedor:	0004653 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	204,224.53	426,684.42
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	015		
Concepto:	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM 5.02		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Unidad admin.:	DF) (ETIQ)		
	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	03		
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Acreeador:	202201MCV00030		
	0004653		
Contrato:	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	10,760.37	437,444.79
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:			
Concepto:	016		
Fuente financ.:	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE 5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	03		
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Acreeador:	202201MCV00030		
	0004653		
Contrato:	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	9,827.80	447,272.59
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Requisición: 01MCV00030  
 Concepto: 017  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202201MCV00030  
 Acreedor: 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ  
 Contrato: 21-2124/007  
 08 ENE 2022 D01MCV0024 1.2.3.5.4.1 4,806.13 452,078.72

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA  
 Requisición: 01MCV00030  
 Concepto: 018  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFA  
 Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)  
 Unidad admin.: 03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa: 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente: 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION  
 Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202201MCV00030  
 Acreedor: 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ  
 Contrato: 21-2124/007



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO




OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO


08 ENE 2022	D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	3,357.92	455,436.64
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
	Requisición:	01MCV00030		
	Concepto:	019		
	Fuente financ.:	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANSVERSAL PA 5.02		
	Unidad admin.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	Programa:	03		
	Componente:	OBRA PUBLICA		
	Actividad:	4101		
	Función:	OBRA PUBLICA FISM		
	C.O.G.:	01		
	Ficha por pagar:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	Acreeedor:	03		
	Contrato:	OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
		221		
		URBANIZACION		
		6.1.4.1		
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
		202201MCV00030		
		0004653		
		LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
		21-2124/007		
08 ENE 2022	D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	384.93	455,821.57
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
	Requisición:	01MCV00030		
	Concepto:	020		
	Fuente financ.:	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN 5.02		
	Unidad admin.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	Programa:	03		
	Componente:	OBRA PUBLICA		
	Actividad:	4101		
	Función:	OBRA PUBLICA FISM		
	C.O.G.:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
		03		
		OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
		221		
		URBANIZACION		
		6.1.4.1		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO




OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO				
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:		202201MCV00030		
Acreedor:		0004653		
		LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:		21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024		1.2.3.5.4.1	1,627.75	457,449.32
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:		021		
Concepto:		EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI		
Fuente financ.:		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03		
		OBRA PUBLICA		
Programa:		4101		
		OBRA PUBLICA FISM		
Componente:		01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:		03		
		OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:		221		
		URBANIZACION		
C.O.G.:		6.1.4.1		
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:		202201MCV00030		
Acreedor:		0004653		
		LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:		21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024		1.2.3.5.4.1	1,100.81	458,550.13
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:		022		
Concepto:		CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II		
Fuente financ.:		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:		03		
		OBRA PUBLICA		
Programa:		4101		
		OBRA PUBLICA FISM		
Componente:		01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS		
	Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	2,416.84	460,966.97
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		
	HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
	01MCV00030		
Requisición:	023		
Concepto:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,		
	ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE		
	INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS		
	Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	156.60	461,123.57
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	ESTIMACION 1 FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		
	HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
	01MCV00030		
Requisición:	024		
Concepto:	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		






MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	5,940.19	467,063.76
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	025		
Concepto:	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS MET		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	21,381.14	488,444.90
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030		
Requisición:	026		
Concepto:	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Fuente financ.:	5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030			
Acreeedor:	0004653	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007			
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA 01MCV00030	2,598.67	491,043.57
Requisición:	027	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIE		
Concepto:	5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Fuente financ.:	03	OBRA PUBLICA		
Unidad admin.:	4101	OBRA PUBLICA FISM		
Programa:	01	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Componente:	03	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Actividad:	221	URBANIZACIÓN		
Función:	6.1.4.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	202201MCV00030			
Ficha por pagar:	0004653	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Acreeedor:	21-2124/007			
Contrato:	1.2.3.5.4.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,027.41	494,070.98



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTIMACION 1 FINIQUITO  
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA  
 01MCV00030

Requisición:  
 Concepto:  
 Fuente financ.:

028  
 RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI  
 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa:  
 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente:  
 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad:  
 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:  
 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:  
 202201MCV00030  
 Acreedor:  
 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ

08 ENE 2022 D01MCV0024

1.2.3.5.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
 ESTIMACION 1 FINIQUITO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA  
 01MCV00030

Requisición:  
 Concepto:

029  
 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO  
 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.:

03  
 OBRA PUBLICA  
 Programa:  
 4101  
 OBRA PUBLICA FISM  
 Componente:  
 01  
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION


Actividad:  
 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función:  
 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.:


6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:  
 202201MCV00030



3,657.11

497,728.09




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO



Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	1,073.88	498,801.97
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	030		
	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	1,993.10	500,795.07
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	031		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
09 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	40,017.02	540,812.09
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	032		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELEC		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS. ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202201MCV00030		
Acreeedor:	0004653		
	LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ		
Contrato:	21-2124/007		
08 ENE 2022 D01MCV0024	1.2.3.5.4.1	4,015.64	544,827.73
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO LOC. EL PARA		
Requisición:	01MCV00030		
Concepto:	033		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
 INVERSION

Actividad: 03  
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202201MCV00030

Acreedor: 0004653  
 LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ

Contrato: 21-2124/007

SUMA PERIODO:.....	544,827.73	0.00	544,827.73
SALDO FINAL:.....	544,827.73	0.00	544,827.73

