

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

05210

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/035

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL  
EN LA LOCALIDAD DE ACOCOGTA, MUNICIPIO D

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TH/2022-03/026  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI  
LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

LOCALIDAD: ACOCOGTA  
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC  
FECHA DE INICIO: 23 MAR 2022  
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202204MCV00022  
MONTO ORIGINAL: \$2,038,420.46  
FECHA DE FIRMA: 23 MAR 2022  
FECHA VENCE: 22 MAY 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: BACHILLERES  
No. Exterior: 7 No. Interior:  
Colonia: CONTLA C. P.: 73900  
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:  
R. F. C.: XCG040108PV2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,038,420.46  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A10271  
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.  
FECHA FIANZA: 23 MAR 2022  
MONTO FIANZA: \$203,842.05

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 22A20392  
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.  
FECHA FIANZA: 22 MAY 2022  
MONTO FIANZA: \$203,842.05



005211

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	2,038,420.46
TOTAL ASIGNADO.....		2,038,420.46



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado: a A.FIN a A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	1.018	20,750.93	20,750.93 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		20,750.93	20,750.93
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	3.907	79,651.05	79,651.05 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		79,651.05	79,651.05
003	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.134	43,506.10	43,506.10 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		43,506.10	43,506.10
004	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.291	128,226.96	128,226.96 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		128,226.96	128,226.96
005	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	6.120	124,751.04	124,751.04 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		124,751.04	124,751.04
006	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	6.502	132,532.69	132,532.69 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		132,532.69	132,532.69
007	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE	52.437	1,068,877.82	1,068,877.82 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,068,877.82	1,068,877.82
008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.535	112,829.95	112,829.95 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		112,829.95	112,829.95
009	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	1.167	23,786.50	23,786.50 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		23,786.50	23,786.50
010	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.905	18,439.27	18,439.27 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		18,439.27	18,439.27
011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁ	0.288	5,869.88	5,869.88 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,869.88	5,869.88
012	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.086	1,802.71	1,802.71 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,802.71	1,802.71
013	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	1.042	21,243.38	21,243.38 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,243.38	21,243.38
014	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.290	5,915.70	5,915.70 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,915.70	5,915.70
015	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG	5.467	111,447.10	111,447.10 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		111,447.10	111,447.10
016	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	0.724	14,766.21	14,766.21 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,766.21	14,766.21
017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIP	0.026	16,830.90	16,830.90 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		16,830.90	16,830.90
018	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.222	4,517.55	4,517.55 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		4,517.55	4,517.55
019	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 K	5.037	102,674.72	102,674.72 100.000 100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		102,674.72	102,674.72
TOTAL		100.000	2,038,420.46	2,038,420.46 100.000 100.000




	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO						
FINANCIERO:	2,038,420.46	100.000	0.00	0.000	2,038,420.46	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 MAY 2022: REPORTE NO.01  
ESTIMACION 1  
CORRESPONDIENTE DEL  
23 DE MARZO AL 22 DE MAYO 2022

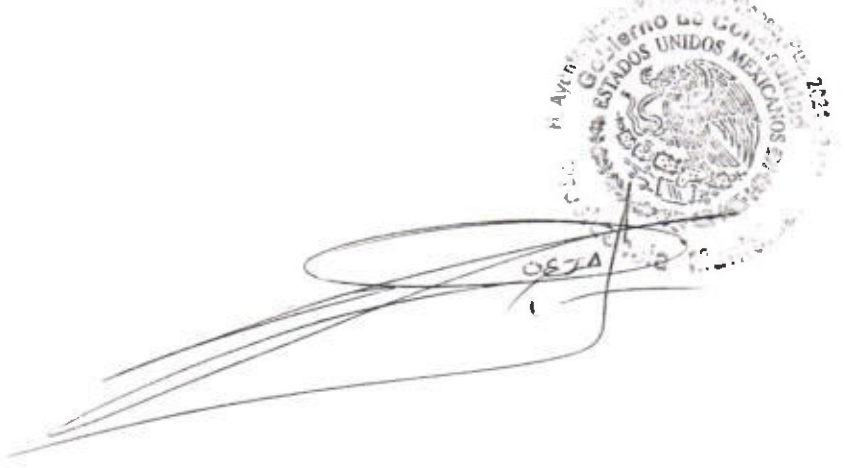

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
22 MAY 2022 D05MVC0032	1.2.3.5.4.1	20,750.93		20,750.93
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL ESTIMACION 1 FINIQUITO			
Requisición:	04MVC0022			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
Componente:	01 OBRA PUBLICA FISM			
Actividad:	03 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Función:	221 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES			
C.O.G.:	6.1.4.1 URBANIZACION			
Ficha por pagar:	302204MVC00022			
Acreedor:	000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
Contrato:	202204MVC00022			
22 MAY 2022 D05MVC0032	1.2.3.5.4.1	79,651.05		100,401.98
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL			
Requisición:	04MVC00022			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA			
Programa:	4101			
Componente:	01 OBRA PUBLICA FISM			
	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Actividad:	03		
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES	
Función:	221		
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:	202204MCV00022		
Acreedor:	0000072		
		XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022	D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	43,506.10      143,908.08
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL	
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	003		
		COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4101		
		OBRA PUBLICA FISM	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION	
Actividad:	03		
		OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES	
Función:	221		
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:	202204MCV00022		
Acreedor:	0000072		
		XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022	D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	128,226.98      272,135.04
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL	
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	004		
		BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	
Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
 RFC: MTP930215QP7  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Funcion:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202204MCV00022		
Acreeedor:	0000072		
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022	D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	124,751.04
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION I FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL	396,886.08
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	005		
Fuente financ.:	5.02		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Funcion:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202204MCV00022		
Acreeedor:	0000072		
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022	D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	132,532.69
		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION I FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL	529,418.77
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	006		
		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	



*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.:	5.02		
	FCNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202204MCV00022		
Acreedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022 D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	1,068,877.82	1,598,296.59
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PÉZMATL		
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	007		
	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 5.02		
Fuente financ.:	5.02		
	FCNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202204MCV00022		
Acreedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022 D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	112,829.95	1,711,126.54
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTIMACION 1 FINIQUITO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDPAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL

Requisición: 04MCV00022  
Concepto: 008  
Fuente financ.: 5.02  
Unidad admin.: 03  
Programa: 4101  
Componente: 01  
Actividad: 03  
Función: 221  
C.O.G.: 6.1.4.1  
Ficha por pagar: 202204MCV00022  
Acreedor: 0000072  
Contrato: 202204MCV00022

22 MAY 2022 D05MCV0032



23,786.50 1,734,913.04

ESTIMACION 1 FINIQUITO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL

Requisición: 04MCV00022  
Concepto: 009  
Fuente financ.: 5.02  
Unidad admin.: 03  
Programa: 4101  
Componente: 01  
Actividad: 03  
Función: 221  
C.O.G.: 6.1.4.1  
Ficha por pagar: 202204MCV00022





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Acceptor:	000072		
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022 D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	18,439.27	1,753,352.31
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL		
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	010		
	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT		
Fuente financ:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
Ficha por pagar:	2.2204MCV00022		
Acceptor:	000072		
Contrato:	202204MCV00022		
22 MAY 2022 D05MCV0032	1.2.3.5.4.1	5,869.89	1,759,222.19
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL		
Requisición:	04MCV00022		
Concepto:	011		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFÁ		
Fuente financ:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OPRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Función: 221  
URBANIZACIÓN  
C.O.G.: 6.1.4.1  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
Fecha por pagar: 202204MVC00022  
Acreedor: 0000072  
XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
Contrato: 202204MVC00022  
22 MAY 2022 D05MVC0032 1.2.3.5.4.1 1,802.71 1,761,024.90

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL

Requisición: 04MVC00022  
Concepto: 012  
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P

Fuente financ.: 5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4101  
OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03  
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
URBANIZACIÓN  
C.O.G.: 6.1.4.1  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

Fecha por pagar: 202204MVC00022  
Acreedor: 0000072  
XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 202204MVC00022  
22 MAY 2022 D05MVC0032 1.2.3.5.4.1 21,243.38 1,782,268.28


DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION 1 FINIQUITO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL

Requisición: 04MVC00022  
Concepto: 013  
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY

Fuente financ.: 5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA  
Programa: 4101  
OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
INVERSION

Actividad: 03  
OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS  
Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202204MCV00022  
Acreedor: 0000072  
XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 202204MCV00022  
22 MAY 2022 D05MCV0032 1.2.3.5.4.1 5,915.70 1,788,183.98

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
ESTIMACION 1 FINIQUITO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL

Requisición: 04MCV00022  
Concepto: 914  
EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI

Fuente financ.: 5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03  
OBRA PUBLICA

Programa: 4101  
OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01  
PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,  
ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE  
INVERSION

Actividad: 03  
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS  
Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221  
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1  
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN



Ficha por pagar: 202204MCV00022  
Acreedor: 0000072  
XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 202204MCV00022  
22 MAY 2022 D05MCV0032 1.2.3.5.4.1 111,447.10 1,899,631.08

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  
ESTIMACION 1 FINIQUITO  
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN EL CAMINO ACOCOGTA-PEZMATL

Requisición: 04MCV00022  
Concepto: 915  
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE P/C-150KG

Fuente financ.: 5.02  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DF) (ETIQ) 03  
 Unidad admin.: 03  
 Programa: OBRA PUBLICA 4101  
 Componentes: OBRA PUBLICA FISM 01  
 Actividad: PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 03  
 Función: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES 221  
 C.O.G.: URBANIZACIÓN 6.1.4.1  
 División DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202204MCV00022  
 Acreedor: 0000072  
 Contrato: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 202204MCV00022  
 22 MAY 2022 D05MCV0032 1.2.3.5.4.1 14,766.21 1,914,397.29



*[Handwritten signature]*

Requisición: 04MCV00022  
 Concepto: 016  
 Fuente financ.: ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03  
 Unidad admin.: OBRA PUBLICA 4101  
 Programa: OBRA PUBLICA FISM 01  
 Componente: PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 03  
 Actividad: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES 221  
 Función: URBANIZACIÓN 6.1.4.1  
 C.O.G.: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202204MCV00022  
 Acreedor: 0000072  
 Contrato: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 202204MCV00022  
 22 MAY 2022 D05MCV0032 1.2.3.5.4.1 16,830.90 1,931,228.19



*[Handwritten signature]*

Requisición: 04MCV00022  
 Concepto: 016  
 Fuente financ.: ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST 5.02  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) 03  
 Unidad admin.: OBRA PUBLICA 4101  
 Programa: OBRA PUBLICA FISM 01  
 Componente: PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION 03  
 Actividad: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES 221  
 Función: URBANIZACIÓN 6.1.4.1  
 C.O.G.: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 Ficha por pagar: 202204MCV00022  
 Acreedor: 0000072  
 Contrato: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 202204MCV00022  
 22 MAY 2022 D05MCV0032 1.2.3.5.4.1 16,830.90 1,931,228.19



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Requisición:	04MCV0022		
Concepto:	017		
Fuente financ.:	5.02		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202204MCV0022		
Acreeedor:	0000072		
Contrato:	202204MCV0022		
22 MAY 2022	D05MCV0032	4,517.55	1,935,745.74
Requisición:	04MCV0022		
Concepto:	018		
Fuente financ.:	5.02		
Unidad admin.:	03		
Programa:	4101		
Componente:	01		
Actividad:	03		
Función:	221		
C.O.G.:	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	202204MCV0022		
Acreeedor:	0000072		
Contrato:	202204MCV0022		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA  
RFC: MTP930215QP7  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

22-MAY-2022 D05MCP0032	1.2.3.5.4.1	102,674.72	2,038,420.46
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION : FINIQUITO		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ACCOOGTA-PEZMATL		
Requisición:	04MCP00022		
Concepto:	019		
	CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO F/C=150 K		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) ETIQ:		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACION		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202204MCP00022		
Acreedor:	0000072		
	MAJBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	00000000000000000000		
SUMA PERIODO:.....		2,038,420.46	0.00 2,038,420.46
SALDO FINAL:.....		2,038,420.46	0.00 2,038,420.46

