

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTP-22-2124/028

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG
TA, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN MPIO TL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP-TH/2022-02/018
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACION
LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022

LOCALIDAD: PEZMATLAN
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 28 FEB 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 MAR 2022


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 22-2124/028
MONTO ORIGINAL: \$1,140,000.00
FECHA DE FIRMA: 26 FEB 2022
FECHA VENCE: 30 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BACHILLERES
No. Exterior: 7 No. Interior:
Colonia: CONTLA C. P.: 73900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA

TELÉFONO:
R. F. C.: XCO040108PV2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,140,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 22A08389
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
FECHA FIANZA: 26 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$114,000.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 22A11538
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
FECHA FIANZA: 30 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$114,000.00



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	1,140,000.00
TOTAL ASIGNADO		1,140,000.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES	0.602	6,857.34	6,857.34	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,857.34	6,857.34		
002	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS	3.338	38,057.02	38,057.02	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		38,057.02	38,057.02		
003	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.876	21,384.83	21,384.83	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		21,384.83	21,384.83		
004	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	6.151	70,124.12	70,124.12	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		70,124.12	70,124.12		
005	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PR	5.377	61,298.25	61,298.25	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		61,298.25	61,298.25		
006	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI	7.338	83,647.58	83,647.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		83,647.58	83,647.58		
007	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE	52.609	599,743.20	599,743.20	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		599,743.20	599,743.20		
008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.488	62,562.45	62,562.45	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		62,562.45	62,562.45		
009	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.281	3,201.09	3,201.09	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,201.09	3,201.09		
010	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	1.141	13,008.24	13,008.24	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,008.24	13,008.24		
011	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.870	9,918.42	9,918.42	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		9,918.42	9,918.42		
012	CALAFATEO DE GRIETAS	0.577	6,575.95	6,575.95	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		6,575.95	6,575.95		
013	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.157	1,787.33	1,787.33	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,787.33	1,787.33		
014	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS	0.286	3,255.16	3,255.16	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		3,255.16	3,255.16		
015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	0.911	10,384.25	10,384.25	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,384.25	10,384.25		
016	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.955	10,888.92	10,888.92	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		10,888.92	10,888.92		
017	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.131	1,491.95	1,491.95	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		1,491.95	1,491.95		
018	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE API	0.456	5,195.58	5,195.58	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		5,195.58	5,195.58		
019	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	9.016	102,782.96	102,782.96	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		102,782.96	102,782.96		
020	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST	1.141	13,008.24	13,008.24	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		13,008.24	13,008.24		
021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO	1.299	14,827.12	14,827.12	100.000	100.000
5.02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU		14,827.12	14,827.12		
TOTAL		100.000	1,140,000.00	1,140,000.00	100.000	100.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	1,140,000.00	100.000	1,140,000.00

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 MAR 2022: REPORTE NO. 01
 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CORRESPONDIENTE DEL 28 DE
 FEBRERO AL 30 DE MARZO
 DEL 2022




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN NO. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	6,857.34		6,857.34
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
	MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG ESTIMACION 1 FINIQUITO			
Requisición:	02MVC00022			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA			
	4101			
Componente:	OBRA PUBLICA FISM			
	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			
Actividad:	03			
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202202MVC00022			
Acreeedor:	0000072			
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
Contrato:	22-2124/028			
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	38,057.02		44,914.36
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
	MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG			
Requisición:	02MVC00022			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS			
	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
Programa:	OBRA PUBLICA			
	4101			
Componente:	OBRA PUBLICA FISM			
	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION			

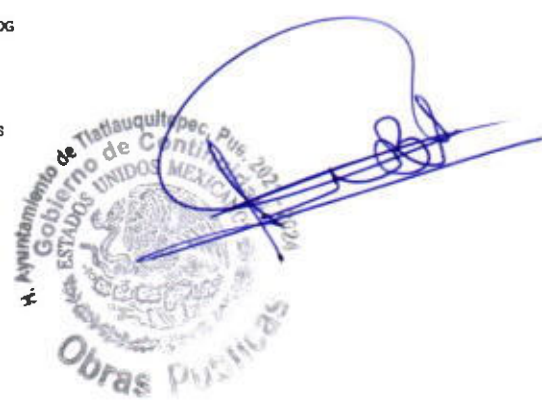

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

<p>Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p>Función: 221 URBANIZACIÓN</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>Ficha por pagar: 202202MCV00022</p> <p>Acreeedor: 0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</p> <p>Contrato: 22-2124/028</p> <p>30 MAR 2022 D03MCV0033 1.2.3.5.4.1</p>	<p>21,384.83</p> <p>66,299.19</p>
<p>Requisición: 02MCV00022</p> <p>Concepto: 003 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA</p> <p>Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM</p> <p>Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION</p> <p>Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p> <p>Función: 221 URBANIZACIÓN</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>Ficha por pagar: 202202MCV00022</p> <p>Acreeedor: 0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</p> <p>Contrato: 22-2124/028</p> <p>30 MAR 2022 D03MCV0033 1.2.3.5.4.1</p>	<p>70,124.12</p> <p>136,423.31</p>
<p>Requisición: 02MCV00022</p> <p>Concepto: 004 BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)</p> <p>Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA</p>	



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 Contrato: 22-2124/028
 30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 61,298.25 197,721.56

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG
 02MVC00022

Requisición:
 Concepto: 005
 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. FR
 5.02

Fuente financ.:
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 Contrato: 22-2124/028

30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 83,647.58 281,369.14

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG
 02MVC00022

Requisición:
 Concepto: 006
 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KI



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA		
Programa:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	202202MVC00022		
Acreedor:	0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	22-2124/028		
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	599,743.20	881,112.34
Requisición:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
Concepto:	MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG 02MVC00022		
Fuente financ.:	007 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 5.02		
Unidad admin.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Programa:	03 OBRA PUBLICA		
Componente:	4101 OBRA PUBLICA FISM		
Actividad:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Función:	03 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN		
Fecha por pagar:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Acreedor:	202202MVC00022		
Contrato:	0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
30 MAR 2022 D03MVC0033	22-2124/028	62,562.45	943,674.79
	1.2.3.5.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG

Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 008
 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 Contrato: 22-2124/028
 30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1

3,201.09

946,875.88

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG

Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 009
 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202202MVC00022




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

<p>Acreeedor: 0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Contrato: 22-2124/028 30 MAR 2022 D03MVC0033</p>	<p>1.2.3.5.4.1 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG Requisición: 02MVC00022 Concepto: 010 ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES Función: 221 URBANIZACION C.O.G.: 6.1.4.1 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION Ficha por pagar: 202202MVC00022 Acreeedor: 0000072 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Contrato: 22-2124/028 30 MAR 2022 D03MVC0033</p>	<p>13,008.24 959,884.12</p>
<p>Requisición: 02MVC00022 Concepto: 011 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ) Unidad admin.: 03 OBRA PUBLICA Programa: 4101 OBRA PUBLICA FISM Componente: 01 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION Actividad: 03 OBRAS DE PAVIMENTACION, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES</p>	<p>9,918.42 969,802.54</p>	



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO			
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202202MVC00022		
Acreedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	22-2124/028		
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	6,575.95	976,378.49
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG		
Requisición:	02MVC00022		
Concepto:	012		
	CALAFATEO DE GRIETAS		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
Actividad:	03		
	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202202MVC00022		
Acreedor:	0000072		
	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
Contrato:	22-2124/028		
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	1,787.33	978,165.82
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG		
Requisición:	02MVC00022		
Concepto:	013		
	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4101		
	OBRA PUBLICA FISM		
Componente:	01		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 22-2124/028

30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 3,255.16 981,420.98

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG
 02MVC00022

Requisición:
 Concepto: 014
 INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VIS

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 22-2124/028

30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 10,384.25 991,805.23

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG
 02MVC00022

Requisición:
 Concepto: 015
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Unidad admn.:	DF) (ETIQ)		
	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	03		
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Acreeedor:	202202MVC00022		
	0000072		
Contrato:	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
	22-2124/028		
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	10,888.92	1,002,694.15
Requisición:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
Concepto:	MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG		
	02MVC00022		
Fuente financ.:	016		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY		
	5.02		
Unidad admn.:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)		
	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
	4101		
Componente:	OBRA PUBLICA FISM		
	01		
Actividad:	PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION		
	03		
Función:	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES		
	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN		
	6.1.4.1		
Ficha por pagar:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Acreeedor:	202202MVC00022		
	0000072		
Contrato:	XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
	22-2124/028		
30 MAR 2022 D03MVC0033	1.2.3.5.4.1	1,491.95	1,004,186.10



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 017
 RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 Contrato: 22-2124/028
 30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1

5,195.58 1,009,381.68

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
 HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG
 Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 018
 EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
 DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS,
 ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE
 INVERSION
 Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS
 Y BANQUETAS DE VIALIDADES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
 Contrato: 22-2124/028



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 102,782.96 1,

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG

Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 019
 GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Contrato: 22-2124/028

30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 13,008.24 1,125,172.00

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG

Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 020
 ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARIST

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



OBRA/ACCIÓN No. MTP-22-2124/028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 Contrato: 22-2124/028

30 MAR 2022 D03MVC0033 1.2.3.5.4.1 14,827.12 1,140,000.00

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 MTP-22-2124/028 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PEZMATLAN-ACOCOG

Requisición: 02MVC00022
 Concepto: 021
 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4101
 OBRA PUBLICA FISM

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE LAS OBRAS, ACCIONES SOCIALES Y PROYECTOS DE INVERSION

Actividad: 03
 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINAMIENTOS Y BANQUETAS DE VIALIDADES

Función: 221
 URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.1
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Ficha por pagar: 202202MVC00022
 Acreedor: 0000072
 Contrato: 22-2124/028

SUMA PERIODO:..... 1,140,000.00 0.00 1,140,000.00
 SALDO FINAL:..... 1,140,000.00 0.00 1,140,000.00

