



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 14 de Julio del 2023


Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas

Oficio: MTP/DOP/07/2262/2023

Asunto: El que se indica

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FAISMUN							OBSERVACIONES				
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	
PUE23010 2207829	16442	186/23-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+140.25, DE LA LOCALIDAD DE ILITA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ILITA	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	100.00%	100.00%	701.25 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23010 2207839	16475	186/23-004	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACCA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL 1+364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	100.00%	100.00%	1364.00 M3	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23020 2215380	17139	186/23-005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOSÉ DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+255.93, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ ORIENTE, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	GÓMEZ ORIENTE	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	\$ 1,709,494.00	100.00%	100.00%	1566.04 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE23010 2208000	17209	186/23-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ÁLVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL ACAVIETE- TEZUITLÁN, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+184.20, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC, PUE.	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	100.00%	48.71%	1112.40 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 48.71% FINANCIERAMENTE, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN FINIQUITO PARA SU POSTERIOR PAGO
PUE23020 2220015	49050	186/23-010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0+000 AL CAD 0+200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	OCOTA	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	0.00%	66.45%	800.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL % FISICA Y FINANCIERAMENTE BI 0%. YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION I FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA

RECIBIDO
 F42/SBICGPSE
 14 JUL 2023
 Gobierno de Puebla
 Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento y Asistente
 SECRETARÍA DE BIENESTAR General de Seguimiento y

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PUE23020 2220364	48713	186/23-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 400 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+400.00 (PRIMERA ETAPA)	CHICUACO	\$	1,094,069.93	\$	1,094,069.93	\$	1,094,069.93	\$	427,099.02	\$	427,099.02	\$	427,099.02	91.29%	39.03%	650.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 91.29 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE A UN 39.03%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN PARA SU POSTERIOR PAGO POR EL ÁREA CONTABLE
PUE23020 2225861	94246	186/23-014	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0+000.00 AL 0+944.00, EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	JALACINGUITO	\$	1,178,161.05	\$	1,178,161.05	\$	1,178,161.05	\$	1,046,704.44	\$	1,046,704.44	\$	1,046,704.44	98.02%	88.84%	920.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 98.02 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE 88.84%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN FINIQUITO PARA SU POSTERIOR PAGO POR EL ÁREA CONTABLE
PUE23020 2225998	95346	186/23-015	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26+101.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	GÓMEZ PONIENTE	\$	1,904,304.94	\$	1,904,304.94	\$	1,904,304.94	\$	-	\$	-	\$	-	%	%	7841.20 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100%. PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE.



 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

 14 JUL 2023

 RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023



95616	186/23-019	HUAXTLA	\$ 747,000.00	\$ 747,000.00	\$ 747,000.00	\$ 747,000.00	100.00%	100.00%	403.16 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE. EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL AREA CONTABLE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE.
PUE23020 2226039	97962	TLATLAUQUITEPEC	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	81.30%	0.00%	200.00 PIEZAS	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE. EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL AREA CONTABLE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE.
PUE23020 2226278	97606	JILJAPA	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	79.37%	19.47%	1000.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA ESTE TRIMESTRE. PRESENTA UN AVANCE DEL 79.37% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 19.47% YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION 1 FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA
PUE23020 2229488	117056	CHINAMPA	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	100.00%	0.00%	780.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SU PAGO SERA EN ESTIMACION 1 FINIQUITO, PARA LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL AREA CONTABLE

RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE
 14 JUL 2023
 Gobierno Municipal de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente




MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023



TLALTLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

PUE23020 2227640	106667	186/23- 025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC, PUEBLA.	PEZMATLAN	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$	\$	29.86%	0.00%	172.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE. EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE.
PUE23020 2228497	111767	186/23- 026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÁN, Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA	PEZMATLAN	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$	\$	%	24.73%	300.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE. EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE.
PUE23020 2227469	105549	186/23- 027	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA, TLALTLAUQUITEPEC, PUEBLA	LA PRIMAVERA	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$	\$	83.33%	0.00%	40.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 83.33% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE al 0%, YA QUE LA EMPRESA COBRARA ESTIMACION Y FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 14 JUL 2023
RECIBIDO
 6742/SB/CGPSE

MUNICIPIO DE TLALT LAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PUE23020 2228674	113083	186/23- 029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECZIN DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+695.65, EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2, EN EL MUNICIPIO DE TLALT LAUQUITEPEC, PUEBLA	TÚNEL 2	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,988,426.48	1,988,426.48	0.00%	61.73%	1000.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN EL AVANCE FINANCIERO, YA QUE EL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE LA OBRA NO TIENE AVANCE.
PUE23020 2228844	114026	186/23- 030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE XTLA PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL 0+120, DEL KM 0+135.50 AL 0+185.50 Y DEL KM 0+347 AL 0+397, EN LA LOCALIDAD DE CUACUAXTLA, MUNICIPIO DE TLALT LAUQUITEPEC, PUEBLA	CUACUAXTLA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,101,140.68	1,101,140.68	0.00%	0.00%	0.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 0% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0% YA QUE LA EMPRESA COBRARÁ ESTIMACION 1 FINIQUITO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA
PUE23020 2228586	112303	186/23- 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO "MÉXICO 68" CON CLAVE Z1EBH0471P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLALT LAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	2,190,485.41	2,190,485.41	0.00%	0.00%	0.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 0.00% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0.00% YA QUE LA EMPRESA COBRARÁ MEDIANTE ESTIMACIONES EL AVANCE DE LA OBRA, HASTA SU CONCLUSION
PUE23020 2228906	114671	186/23- 036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLALT LAUQUITEPEC, PUEBLA	JILOTEPEC	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	1,229,058.31	1,229,058.31	%	%	0.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN AVANCE DEL 0.00% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0.00% YA QUE LA EMPRESA COBRARÁ MEDIANTE ESTIMACIONES EL AVANCE DE LA OBRA, HASTA SU CONCLUSION

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Gobierno de Puebla
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente
14 JUL 2023
RECIBIDO
F/42/SB/CGPSE

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FORTAMUN-DF							OBSERVACIONES			
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA
TMP_PUE2 23020232 2950		186/23-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,807,850.84	\$ 1,807,850.84	\$ 1,807,850.84	100.00%	95.00%	200 PIEZAS	A ESTE TRIMESTRE LA EMPRESA VA SUMINISTRANDO LOS CALENTADORES Y POR CUESTIONES CLIMÁTICAS, HAY UN RETRASO EN LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS YA QUE EL MUNICIPIO PRESENTA CONSTANTES LLUVIAS EN ESTA TEMPORADA AUNADO A ESO ALGUNAS VIVIENDAS NO SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE ALGUNA VIALIDAD DE FÁCIL ACCESO Y SE TIENE QUE TRASLADAR LAS PIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN TRAMOS LARGOS POR VEREDAS, LO QUE HA CONTRIBUIDO A UN RETRASO EN LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS
TMP_PUE2 3020232 284		186/23-018	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y COMPACTADOR DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 2,759,900.00	\$ 2,759,900.00	\$ 2,759,900.00	\$ 2,759,900.00	\$ 2,759,900.00	\$ 2,759,900.00	\$ 2,759,900.00	100.00%	100.00%	1 VEHICULO	ACCIÓN TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
TMP_PUE2 3020232 252		186/23-033	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "RELACIONES EXTERIORES" EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	0.00%	0.00%	0.00 M2	A ESTE TRIMESTRE NO HAY AVANCE FINANCIERO YA QUE ACABAN DE INICIAR CONTRATO, Y FÍSICAMENTE SE CONTRATO A VARIOS TRABAJADORES PARA PODER AVANZAR RAPIDAMENTE


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Puebla
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 FMZ/SBC/CPSE



TLAXIAHUAC
GOBIERNO MUNICIPAL
CALLE MEXICALCATEPEC 200
C.P. 39000, Tlaxiahuac, Tlaxcala

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA M&G

INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	19	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	3er. Trimestre	0.00	0	44				
	4to. Trimestre	1.92	1	52				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	35.00	7	20	31.58	6	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR, LA META PLANEADA, YA QUE DE LAS 7 PLANEADAS SOLO SE ENCUENTRAN EN PROCESO 6 OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	34.09	15	44				
	4to. Trimestre	36.54	19	52				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	75.00	3	4	75.00	3	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR 3 OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	65.00	13	20	68.42	13	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR, LA META PLANEADA, YA QUE DE LAS 20 PLANEADAS SOLO SE ENCUENTRAN EN PROCESO 19 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	65.91	29	44				
	4to. Trimestre	61.54	32	52				



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	8,222,858.00	49,337,148.00	16.67	8,222,858.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO A RELLENO SANITARIO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE.
	2do. Trimestre	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALLUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA.
	3er. Trimestre	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00				
	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00		0.00	0.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	2.52	1,244,737.00	49,337,148.00	2.52	1,244,737.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SOLO SE REALIZÓ EL PAGO EL ALLUMBRADO PÚBLICO, YA QUE EL CONVENIO DE PAGO DE RELLENO SANITARIO, TUVO MODIFICACIONES EN ALGUNAS CUÁDRICULAS, POR LO QUE NO SE REQUISITO DE MANERA CORRECTA PARA PAGO; LA CARTA MANDATO PARA EL PAGO DE CERESO NOS FUE REMITIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL, PARA EL PAGO DE CONAGUA, SE AGREGO UN NUEVO SERVICIO Y SE ESTÁ DANDO DE ALTA EN SISTEMA PARA REALIZAR EL PAGO, Y LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE TUVO EL PRIMER PAGO EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL.
	2do. Trimestre	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	27.56	13,596,896.73	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE A REALIZADO EL PAGO DE ALLUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, LA APORTACIÓN AL CERESO, PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, ACCIONES COMO FERTILIZANTES Y ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, Y LA ADQUISICIÓN DE UN CAMION COMPACTADOR.
	3er. Trimestre	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00				
	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.39	20,557,145.00	8,613,842.00	1.98	20,557,145.00	10,369,685	A ESTE TRIMESTRE SE REPORTA LOS INGRESOS PROPIOS CAPTURADOS HASTA LA FECHA DE ACUERDO AL OFICIO Nº TES/695/06/2023 EMITIDO POR EL AREA DE TESORERIA, EN LA CUAL HACEN DE CONOCIMIENTO QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION CONTABLE AL MES DE JUNIO
	4to. Trimestre	2.86	49,337,148.00	17,227,685.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to Trimestre	0.01	214,022,843.00	213,995,842.00	-100.00			

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Puebla
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 F472/SB/C/CPSE

Enti	Mur	Tipo	Ciclo	Tipi	Clai	Mo	Prog	Program	Institucion	E	Rendimiento	Reir	Tipo	Parti	Aprobado	Modificado	Recaudado(n	Comprometit	Devengado	Ejercido	Pagado	Co	Pri	Observaciones	
21	186	1	2023	2	33	1	4	FAIS	Municip		1	36284.18	0												
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS	Municip	Municip		2	612	13306779.4	17435011.7	5545083.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (infraestructura cultural y educativa; construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, espacios multideportivos, salon de usos multiples, centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)

21	186	2	2023	33	1	4	FAIS	Municip	Municip		2	613	17560797.9	14596694.4	808741.63	808741.63	0	0	0	0	0	0	0	0	construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje)
----	-----	---	------	----	---	---	------	---------	---------	--	---	-----	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---


21	186	2	2023	33	1	4	FAIS	Municip	Municip		2	614	24763687.9	23848908.3	23848908.3	5981743.88	5981743.88	5981743.88	5981743.88	5981743.88	5981743.88	5981743.88	5981743.88	5981743.88	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarniciones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)
----	-----	---	------	----	---	---	------	---------	---------	--	---	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--




Enti	Mur	Tipo	Ciclo	Tipt	Clai	Mo	Pog	Program	Institucion	E	Rendimiento	Reir	Tipo	Parti	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometir	Devengado	Ejercido	Pagado	Co	Pr	Observaciones	
21	186	2	2023	33	I	4	FAIS	Municipio	Municipio		2	615	4595436.09	6283833.71	3772585.09	3772585.09	1270000	1270000	1270000	1270000	1270000			Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	
21	186	2	2023	33	I	4	FAIS	Municipio	Municipio		2	622	2635500	2635500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)
21	186	2	2023	33	I	4	FAIS	Municipio	Municipio		2	626	4128232.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)
21	186	2	2023	33	I	4	FAIS	Municipio	Municipio		1	441	3020000	3020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)
21	186	2	2023	33	I	4	FAIS	Municipio	Municipio		1	531	2321174.39	2321174.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Equipo médico y de laboratorio (camera multisensorial y material ortopedico)
21	186	2	2023	33	I	4	FAIS	Municipio	Municipio		1	629	0	2190485.41	2190485.41	2190485.41	0	0	0	0	0	0	0	0	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física
21	186	1	2023	2	33	I	5	FORTA	Municipio		1	20878.57	0	20878.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad publica)
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	MUN	MUN		1	113	5875962.88	5875962.88	4295118.23	1816100.6	0	0	0	0	0	0	0	0	Aguiinaldo o gratificación de fin de año (aguiinaldos de elementos de seguridad publica)
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	MUN	MUN		1	132	912670.71	912670.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aguiinaldo o gratificación de fin de año (aguiinaldos de elementos de seguridad publica)
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	MUN	MUN		1	853	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	2466857.4	Otros Convenios (aportacion al cesero)



Enti	Mur	Tipo	Ciclo	Tipi	Cla	Mo	Pog	Program	Institucion	E	Rendimiento	Reir	Tipo	Parti	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometir	Devengado	Ejercido	Pagado	Co	Pri	Observaciones	
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	Municipio	de	Tiatlauquite	pec	2	622	4000000	5436904.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	Municipio	de	Tiatlauquite	pec	2	629	1500000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salones de usos múltiples y techados comunitarios)
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	Municipio	de	Tiatlauquite	pec	1	272	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Prendas de seguridad y protección personal
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	Municipio	de	Tiatlauquite	pec	1	565	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)
21	186	2	2023	33	I	5	FORTA	Municipio	de	Tiatlauquite	pec	2	615	3050728.41	3050728.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)




CICLO	TRIMESTRE	FOJO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBR	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECUADRO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE23020227839	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC PUEBLA.-16475	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Ciudad Tlatlahuquepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlahuquepec	16475	185	185	185	Metros cúbicos	1864	01/04/2023	30/04/2023	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1270000	Validado avances
2023	2	PUE23020227840	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA.-106667	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Pezmatlan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlatlahuquepec	106667	85	86	86	Metros Cuadrados	576	09/06/2023	07/08/2023	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE23020220364	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDRALCO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC PUE. DE 400 M. DE LONGITUD DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 PRIMERA ETAPA.-48713	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Chicuco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlahuquepec	48713	38	37	37	Metros Cuadrados	712	15/04/2023	13/07/2023	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	427,099.02	427,099.02	427,099.02	Validado avances
2023	2	PUE23020227869	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA TLATLAHUQUEPEC PUEBLA.-105549	Puebla	186	Tlatlahuquepec	La Primavera	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlahuquepec	105549	21	20	20	Metros Cuadrados	48	09/06/2023	07/08/2023	598,280.15	598,280.15	598,280.15	0.00	0.00	0	Validado avances
2023	2	PUE23020229498	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPÁ EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC PUEBLA.-117056	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Chinampa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlahuquepec	117056	25	25	25	Metros Cuadrados	780	27/06/2023	28/07/2023	997,614.15	997,614.15	997,614.15	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE23010228000	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL ACQUETE TEBULAN DEL CAO. 0 MAS 000 AL CAO. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAHUQUEPEC, PUE.-17209	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Ocotlan Betancourt	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlahuquepec	17209	415	415	415	Metros Cuadrados	1111.4	03/04/2023	03/07/2023	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	723,627.98	723,627.98	723,627.98	Validado avances
2023	2	PUE23020220415	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACOSTIN DE TURBOE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLA DEL CAO. 0 MAS 000 AL CAO 0 MAS 200.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC PUE.-49500	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Cocla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlahuquepec	49500	53	52	52	Metros Cuadrados	1204	18/04/2023	17/07/2023	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	2	PUE23020228674	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MARI CAMINO A COATEPECIN DEL CAO 0 MAS 695.65 EN LA LOCALIDAD DE EL TUNEL 2 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC PUEBLA.-113083	Puebla	186	Tlatlahuquepec	Tunel Dos	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlahuquepec	113083	105	105	105	Metros Cuadrados	1620	13/06/2023	11/08/2023	2,107,237.47	1,988,426.48	1,988,426.48	0.00	0.00	0.00	Validado avances

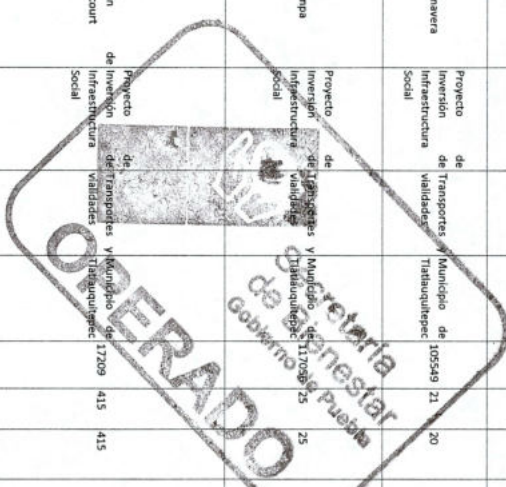

CICLO	TRIM ESTRE	FOUO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMIAGES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	2	PUE23002215380	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOSE DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 255.93 EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ ORIENTE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- 11239	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Gómez Oriente	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlaquitespec	11239	200	200	0	Metros Cuadrados	1566.04	02/04/2023	03/07/2023	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	Validado avances	
2023	2	PUE23002252961	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE POLORES BETANCOURT DEL KM. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 944.00 EN LA LOCALIDAD DE JACAQUILITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - PRIMERA ETAPA.- 94246	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Ciudad Tlatlaquitespec	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlaquitespec	94246	55	55	0	Metros Cuadrados	988.6	16/05/2023	14/07/2023	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,046,704.44	1,046,704.44	Validado avances
2023	2	PUE23002226317	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- PRIMERA ETAPA.- 97962	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Ciudad Tlatlaquitespec	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de Tlatlaquitespec	97962	750	750	0	Piezas	246	16/05/2023	14/07/2023	808,741.63	808,741.63	808,741.63	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2023	2	PUE23002225998	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SAC. COEQUEAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 36 MAS 101.00 KM EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- 95346	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaquitespec	95346	750	750	0	Metros Cuadrados	784.2	23/05/2023	21/07/2023	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2023	2	PUE23002226278	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A HUAPPA EN LA COMUNIDAD DE HUAPPA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 210.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- PRIMERA ETAPA.- 97605	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Atlapa	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlaquitespec	97605	164	163	0	Metros Cuadrados	1260	16/05/2023	14/09/2023	1,716,239.24	1,542,790.50	1,542,790.50	295,818.44	295,818.44	295,818.44	Validado avances	
2023	2	PUE23002226039	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A HUAYTLA Y CALLE ING. LUIS NAVARRO DEL CAD. KM 0 MAS 000. AL 0 MAS 075.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAYTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- 95616	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Ciudad Tlatlaquitespec	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlaquitespec	95616	40	40	0	Metros Cuadrados	403.16	10/05/2023	07/07/2023	875,047.47	747,000.00	747,000.00	747,000.00	747,000.00	747,000.00	Validado avances	
2023	2	PUE23002228497	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE M. JESUS COLUHEN, EN LA LOCALIDAD DE PEZAMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA.- 111767	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Pezmatlan	Proyecto de Inversión Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlaquitespec	111767	75	75	0	Metros Cuadrados	1213.16	20/06/2023	18/08/2023	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2023	2	PUE23002228866	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION FISICA, EN EL BACHILLERATO MEXICO 68 CON CLAVE 21EHO471P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- 112303	Puebla	186	Tlatlaquitespec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión Social	Educación	Municipio de Tlatlaquitespec	112303	60	60	0	Metros Cuadrados	587.18	20/06/2023	18/09/2023	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	0.00	0.00	0.00	Validado avances	



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO RECURSIVO	ID_BA	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA PRESUPUESTAL	TIPO RECURSO	PROG_FUNDACION	INSTITUCION EJECUTORA	RENOMBRAMIENTO	RENTIG	TIPO GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CURTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac	36284.18	0	Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2875568.88	23848908.33	23848908.33	17365333.62	5981743.88	5981743.88	5981743.88	División de terrenos y urbanización (construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarderías, banquetas, pavimentos en vialidad del municipio)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	614	Construcción de vías de comunicación	4595496.09	628883.71	3772585.09	3772585.09	1270000.00	1270000.00	1270000.00	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras y veredas)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	615	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	412823.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	3020000.00	3020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ayudas sociales a personas (VVVENIA)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto corriente	531	Equipo médico y de laboratorio	2321174.39	2321174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo médico y de laboratorio (cámara de laboratorio y material ortopédico)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	622	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2635500.00	2635500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	613	Edificación no habitacional	13306779.44	17435011.74	5545083.54	0	0	0	0	Edificación no habitacional (infraestructura cultural y educativa, construcción de aulas, dirección y módulos, techado en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, espacios deportivos, salón de usos múltiples, centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAS Municipal	Municipio de Tlaxiahuac			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad, gas, electricidad y telecomunicaciones	17560797.90	14536694.42	808741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje)	Validado	
1-Programa presupuestario	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	1	Gasto Federalizado	FORTAMUM	(APORTACIONE 5, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUM	Municipio de Tlaxiahuac	20873.57	0													Validado

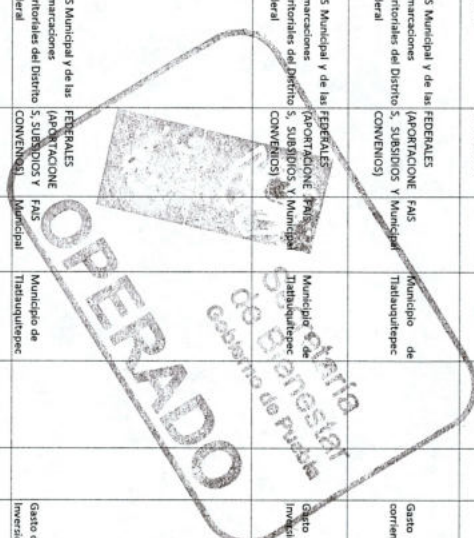

TIPO_REGISTRO	CICLO	TIEMPO DE EJECUCION	ID ENTIDAD FEDERAL	ID MUNICIPIO	CICLO RECURSIVO	ID RAMO	ID MODIFICACION	ID PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROC. FIN. CONV. ESP.	INSTITUCION ELECTORA	RENOMBRAMIENTO	RENTES O GASTOS	ID PARTIDA GENERAL	DESCRIPCION PARTIDA GENERAL	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS				
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	5672573.96	2759900.00	2759900.00	2759900.00	2759900.00	2759900.00	2759900.00	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos y equipamiento para servicio público municipal)	Validado			
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	5466904.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)	Validado			
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto de Inversión	561	Terrenos	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terrenos (adquisición de predios)	Validado			
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	311	Energía eléctrica	9000000.00	9000000.00	3034561.00	3034561.00	3034561.00	3034561.00	3034561.00	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)	Validado			
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto de Inversión	629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1500000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salón de usos múltiples y techado comunitario)	Validado			
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	5875962.88	5875962.88	4259118.23	1816100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sueldos base al personal permanente (sueldo de elementos de seguridad pública)	Validado		
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	132	Primas de vacaciones, indemnidad y gratificación al fin de año	912670.71	912670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Primas de vacaciones, indemnidad y gratificación al fin de año	Validado		
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2200000.00	2200000.00	973213.49	973213.49	973213.49	973213.49	973213.49	973213.49	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por saneamiento de riego sanitario)	Validado		
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	653	Otros convenios	2466857.40	2466857.40	2466857.40	2466857.40	2466857.40	2466857.40	2466857.40	Otros convenios (aportación al censo)	Validado			
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	523	Cameras fotograficas y de video	2000000.00	1524012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	cameras fotograficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)	Validado
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	565	Equipo de comunicación y telecomunicación	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)	Validado	
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	246701	246701	57514	57514	57514	57514	57514	57514	57514	Impuestos y derechos (CONSIGUA)	Validado	
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	272	Primas de seguridad y protección personal	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Primas de seguridad y protección personal	Validado
2-Partida generica	2023	21	Puebla	186	Tehuacanquiquepec 2023	33			Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tehuacanquiquepec		Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	8611653.64	8063409.83	6569980.88	4304850.84	4304850.84	4304850.84	4304850.84	4304850.84	4304850.84	4304850.84	ayudas sociales a personas (carteras sociales, empujones académicos, cedoneros pluviales, trancos, etc.)	Validado



TIPO REGISTRO	CICLO	TRIMES	ID_ENT	ENTIDAD	ID_M	MUNICIPIO	CICLO	ID_PA	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA PRESUP	TIPO RECURSO	PROG_FNO	INSTITUCION_E	RENDIMIENTO	RENTEG	TIPO_GAST	ID_PARTI	DESC_PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxhuquidpec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Gasto Federalizado	Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaxhuquidpec		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento) Validado de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adquirentes)	Validado
2-Partida genérica	2023	2	21	Puebla	186	Tlaxhuquidpec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Gasto Federalizado	Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaxhuquidpec		Gasto de Inversión	615	Construcción de obras de urbanización	3050728.41	3050728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de obras de urbanización (rehabilitación de caminos)	Validado



INDICADORES

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramificación	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	2	Puebla	Tlatahuquepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:gustavoabe navidez,fecha:10/07/23}}	0	100	Validado
2023	2	Puebla	Tlatahuquepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.3865 2	2.386 52	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:gustavoabe navidez,fecha:12/07/23}}	1.98243	120.38	Validado
2023	2	Puebla	Tlatahuquepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	35	35	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:gustavoabe navidez,fecha:10/07/23}}	31.57895	90.23	Validado
2023	2	Puebla	Tlatahuquepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.666 67	41.66 667	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:gustavoabe navidez,fecha:12/07/23}}	27.55914	66.14	Validado
2023	2	Puebla	Tlatahuquepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.666 67	41.66 667	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:gustavoabe navidez,fecha:12/07/23}}	41.66667	100	Validado
2023	2	Puebla	Tlatahuquepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	65	65	{just1:{ciclo:2023,trim:2,jus t:Otras causas,usuario:gustavoabe navidez,fecha:10/07/23}}	68.42105	95	Validado

SEGUNDO TRIMESTRE 2023
