



TLATLAUQUITEPEC

GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024
usos, costumbres y tradiciones

Tlatlauquitepec, Puebla a 13 de Octubre del 2023


Dependencia: Presidencia Municipal

Área: Obras Públicas

Oficio: MTP/DOP/10/2457/2023

Asunto: El que se indica.

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN DF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

📍 Av. Reforma No. 47A Col. Centro Tlatlauquitepec Puebla

☎ Teléfono: 01 (233) 31 8 00 01

🌐 www.ayuntamientotlatlauquitepec.gob.mx

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023




FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	19	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	3er. Trimestre	0.00	0	44	0.00	0	41	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	4to. Trimestre	1.92	1	52				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	35.00	7	20	31.58	7	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR, LA META PLANEADA, YA QUE DE LAS 7 PLANEADAS SOLO SE ENCUENTRAN EN PROCESO 6 OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	34.09	15	44	39.02	16	41	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA DE ACUERDO A LA PLANEACION, YA QUE DE LAS 15 PLANEADAS SE LOGRARON EJECUTAR 16 ENTRE ELLAS, CAMINOS SACA COSECHAS, ELECTRIFICACIONES, DRENAJES Y TECHUMBRES EN ESPACIOS MULTIDEPORIVOS
	4to. Trimestre	36.54	19	52				



Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	75.00	3	4	75.00	3	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR 3 OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	65.00	13	20	68.42	13	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR, LA META PLANEADA, YA QUE DE LAS 20 PLANEADAS SOLO SE ENCUENTRAN EN PROCESO 19 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	65.91	29	44	60.98	25	41	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 29 PROYECTOS PLANEADOS SOLO SE LOGRAN 25, YA QUE LOS DEMÁS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE DE LOS 25 PROYECTOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA MIDS SOLO UN PROYECTO NO MIGRO EL CUAL CORRESPONDE AL FOLIO 211346 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION NORTE, EN LA COMUNIDAD DE MECAYUCAN DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+110.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.
	4to. Trimestre	61.54	32	52				

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	8,222,858.00	49,337,148.00	16.67	8,222,858.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO A RELLENO SANITARIO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE
	2do. Trimestre	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA
	3er. Trimestre	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA, SE CONSTRUYERON LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES PARA BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACION EN GENERAL, TAMBIEN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EL PAGO DE SUELDOS DE JULIO A SEPTIEMBRE ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EN TRÁMITE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL
	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00		0.00	0.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	1er. Trimestre	2.52	1,244,737.00	49,337,148.00	2.52	1,244,737.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SOLO SE REALIZÓ EL PAGO EL ALUMBRADO PÚBLICO, YA QUE EL CONVENIO DE PAGO DE RELLENO SANITARIO, TUVO MODIFICACIONES EN ALGUNAS CLÁUSULAS, POR LO QUE NO SE REQUISITO DE MANERA CORRECTA PARA PAGO; LA CARTA MANDATO PARA EL PAGO DE CERESO NOS FUE REMITIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL, PARA EL PAGO DE CONAGUA, SE AGREGO UN NUEVO SERVICIO Y SE ESTÁ DANDO DE ALTA EN SISTEMA PARA REALIZAR EL PAGO, Y LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE TUVO EL PRIMER PAGO EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL
	2do. Trimestre	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	27.56	13,596,896.73	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE A REALIZDO EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, LA APORTACION AL CERESO, PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, ACCIONES COMO FERTILIZANTES Y ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, Y LA ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR

Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 13 OCT 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	3er. Trimestre	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00	53.83	26,560,066.72	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE A REALIZADO EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, LA APORTACIÓN AL CERESO, PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, ACCIONES COMO FERTILIZANTES APOYOS A AGRICULTORES Y ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, APOYOS ESCOLARES Y LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR, PAGO DE SUELDOS A POLICÍAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, TENEMOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN PAGO DE SUELDOS JULIO A SEPTIEMBRE, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y UN CONVENIO CON EL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MOTIVO, SE ESTÁ RESERVANDO EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO UNA VEZ OBTENIDAS LAS OPINIONES FAVORABLES POR PARTE DE CONSEJO ESTATAL DE VINCULACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00				

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.39	20,557,145.00	8,613,842.00	1.98	20,557,145.00	10,369,684.89	A ESTE TRIMESTRE SE REPORTARON LOS INGRESOS PROPIOS CAPTURADOS HASTA LA FECHA DE ACUERDO AL OFICIO Nº TES/695/06/2023 EMITIDO POR EL AREA DE TESORERIA, EN LA CUAL HAYEN DE CONCORDAR
	4to. Trimestre	2.86	49,337,148.00	17,227,685.00				

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	0.01	214,022,843.00	213,995,842.00	-100.00			



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102208000	17209	186/23-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ÁLVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE- TEZIUTLÁN, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+184.20, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC, PUE.	OCOTLAN DE BETANCOURT	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	\$ 1,485,571.20	100.00%	100.00%	1112.40 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202220415	49050	186/23-010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0+000 AL CAD 0+200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE	OCOTA	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	\$ 1,633,235.28	100.00%	100.00%	1204 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202220364	48713	186/23-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 400 M. DE LONGITUD, DEL 0+000.00 AL 0+400.00	CHICUACO	\$ 1,094,069.93	\$ 1,094,069.93	\$ 1,094,069.93	\$ 1,094,069.93	\$ 1,094,069.93	\$ 1,094,069.93	\$ 1,094,069.93	100.00%	100.00%	712.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302248142	152679	186/23-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TATAUZOQUICO	\$ 2,136,605.11	\$ 2,136,605.11	\$ 2,136,605.11	\$ 2,136,605.11	\$ 2,136,605.11	\$ 2,136,605.11	\$ 2,136,605.11	100.00%	100.00%	483.71 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023




PUE230202 225861	94246	186/23- 014	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0+000.00 AL 0+944.00, EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	JALACINGUITO	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	\$ 1,178,161.05	100.00%	100.00%	938.60 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202 225998	95346	186/23- 015	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26+101.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	GÓMEZ PONIENTE	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	\$ 1,904,304.94	100.00%	100.00%	7841.20 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202 226317	97962	186/23- 020	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TLATLAUQUITEPEC	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	\$ 808,741.63	100.00%	100.00%	246 PIEZAS	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202 226278	97606	186/23- 021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO A JILIAPA, EN LA COMUNIDAD DE JILIAPA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+210.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. (PRIMERA ETAPA)	JILIAPA	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	\$ 1,542,790.50	100.00%	100.00%	1260.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN


RECIBIDO
 FIAZ/SRCPSE
 13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
 del Gobierno de Puebla

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023



PUE230302 251243	170079	186/23- 022	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL 1+193.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE PABLOGCO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PABLOGCO	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	954.40 M3	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA.
PUE230302 258479	214284	186/23- 023	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN, LOCALIDAD GÓMEZ SUR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	GÓMEZ SUR	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ -	\$ -	\$ -	30.00%	0.00%	19 PIEZAS	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO POR LO CUAL N O SE VE UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL AVANCE DE LA OBRA
PUE230202 229498	117056	186/23- 024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CHINAMPA	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	\$ 997,614.15	100.00%	0.00%	780.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202 227640	106667	186/23- 025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	PEZMATLAN	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	\$ 1,053,508.81	100.00%	100.00%	576.00 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN


RECIBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
 FIAZ/SICOP/SE

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023




PUE230202 228497	111767	186/23-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA	PEZMATLAN	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	\$ 1,626,772.04	100.00%	100.00%	1213.26 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202 227469	105549	186/23-027	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	LA PRIMAVERA	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	\$ 598,280.15	100.00%	100.00%	48.00 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 248305	153474	186/23-028	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC. PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	189.00 ML	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA.


RECIBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación del
 Sistema

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

PUE230202228674	113083	186/23-029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+695.65, EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TÚNEL 2	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	\$ 1,988,426.48	100.00%	0.00%	1000.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230202228844	114026	186/23-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL 0+120, DEL KM 0+135.50 AL 0+185.50 Y DEL KM 0+347 AL 0+397, EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUACUALAXTLA	\$ 1,101,140.68	\$ 1,101,140.68	\$ 1,101,140.68	\$ 1,101,140.68	\$ 686,294.94	\$ 686,294.94	\$ 686,294.94	\$ 686,294.94	0.00%	0.00%	0.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$330,342.20 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 \$6480,406.46 EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$686,294.94
PUE230202228586	112303	186/23-031	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO "MÉXICO 68" CON CLAVE 21EBH0471P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 2,190,485.41	\$ 2,190,485.41	\$ 2,190,485.41	\$ 2,190,485.41	\$ 876,484.82	\$ 876,484.82	\$ 876,484.82	\$ 876,484.82	100.00%	0.00%	0.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$657,145.62 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 \$ 613,539.37, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$876,484.82



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023




PUE230302 248349	153745	186/23- 032	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL ZOPILOCO, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	100.00%	4 PIEZAS	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230302 248484	154507	186/23- 034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO – TOCHIMPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. 2DA ETAPA	XACUINCO	\$ 1,034,384.34	\$ 1,034,384.34	\$ 1,034,384.34	\$ 1,034,384.34	\$ -	\$ -	\$ -	75.00%	0.00%	590.50 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$310,315.30 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 \$ 510,697.21, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$729,567.45
PUE230302 251292	170360	186/23- 035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEODOMIRO MÉNDEZ (XOPANACO), EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 1,013,879.46	\$ 1,013,879.46	\$ 1,013,879.46	\$ 1,013,879.46	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	840.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.

RECIBIDO
13 OCT 2023
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023


PUE230202 228906	114671	186/23-036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	JILOTEPEC	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	\$ 1,229,058.31	100.00%	100.00%	140.40 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 251362	170849	186/23-037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO "QUETZALCÓATL", CON CLAVE 21EBH0307P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN	\$ 2,230,751.10	\$ 2,230,751.10	\$ 2,230,751.10	\$ 2,230,751.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	70.00%	0.00%	551.32 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO EL ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230302 251445	171321	186/23-039	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO", CON CLAVE 21DPR35350, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 2,410,214.82	\$ 2,410,214.82	\$ 2,410,214.82	\$ 2,410,214.82	\$ 544,233.63	\$ 544,233.63	\$ 544,233.63	\$ 544,233.63	75.00%	0.00%	614.81 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$723,064.45 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 \$ 380,962.83, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$544,232.63



RECIBIDO
13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 ASISTENTE

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023


PUE230302 248421	154204	186/23-041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+165.00, EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	AJOCOTZINGO	\$ 1,251,564.79	\$ 1,251,564.79	\$ 1,251,564.79	\$ 1,251,564.79	\$ 496,980.10	\$ 496,980.10	\$ 496,980.10	100.00%	0.00%	834.60 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE HA PAGADO \$496,980.10, SU ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA.
PUE230302 257933	211375	186/23-042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 250 M DE LONGITUD, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+250.00	TEHUAGCO	\$ 1,525,942.17	\$ 1,525,942.17	\$ 1,525,942.17	\$ 1,525,942.17	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO
PUE230302 248484	154507	186/23-043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE XALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XALTENANGO	\$ 1,096,448.04	\$ 1,096,448.04	\$ 1,096,448.04	\$ 1,096,448.04	\$ 582,817.96	\$ 582,817.96	\$ 582,817.96	100.00%	0.00%	0.00	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y ESTIMACION 2, SU ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.



RECIBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023


PUE230302 258455	214187	186/23- 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CON CLAVE 21DTV0123S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	OYAMELES	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	\$ 2,323,254.19	\$ -	\$ -	\$ -	30.00%	0.00%	0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO
PUE230302 250667	167230	186/23- 046	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZAPATA, CALLE HERNÁNDEZ, CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TZINCUILAPAN	\$ 1,762,496.44	\$ 1,762,496.44	\$ 1,762,496.44	\$ 1,762,496.44	\$ 1,176,972.90	\$ 1,176,972.90	\$ 1,176,972.90	0.00%	0.00%	0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$528,748.93 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 \$823,881.03 , EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$1,176,972.90
PUE230302 253720	183731	186/23- 047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+180.00, EN LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TANHUIXCO DEL CARMEN	\$ 1,626,305.11	\$ 1,626,305.11	\$ 1,626,305.11	\$ 1,626,305.11	\$ 1,424,159.26	\$ 1,424,159.26	\$ 1,424,159.26	0.00%	0.00%	0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$487,891.53 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 \$ 996,911.48, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$1,424,159.26



RECIBIDO
 FINANCIEROS/CPSE
 19 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación de Recursos
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

PUE230302 248640	155688	186/23- 048	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL 0+420, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPEHICAN	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	\$ 544,915.70	100.00%	100.00%	696.93 M3	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 257907	211273	186/23- 049	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT – PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+ 350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLAN DE BETANCOUR T	\$ 1,589,870.61	\$ 1,589,870.61	\$ 1,589,870.61	\$ 1,589,870.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	0.00	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE al 0%, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA.
PUE230302 258460	214209	186/23- 051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ASERRADERO A ATALPA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+250.00, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	ATALPA	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	\$ 1,015,819.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSESO A PAGADO ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN
PUE230302 258464	214217	186/23- 058	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 6+600.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	SAN AGUSTIN CHAGCHALTZ IN	\$ 1,420,689.49	\$ 1,420,689.49	\$ 1,420,689.49	\$ 1,420,689.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUICIO AL ANTICIPO



 RECEBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

PUE230302 261241	231258	186/23-059	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0+000.00 AL 0+218.83, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	MAZATEPEC	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	\$ 1,850,202.76	\$ -	\$ -	\$ -	30.00%	30.00%	0.00	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSESO A PAGADO ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230302 262142	236020	186/23-061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	PEZMATLAN	\$ 1,187,815.66	\$ 1,187,815.66	\$ 1,187,815.66	\$ 1,187,815.66	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO


FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2 3020223295 0		186/23-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	\$ 1,903,000.88	100.00%	100.00%	200 PIEZAS	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

TMP_PUE23 0202232252	186/23- 033	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "RELACIONES EXTERIORES" EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	TLATLAUQUI TEPEC	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	\$ 1,370,070.25	100.00%	100.00%	137.53 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
	186/23- 054	ADQUISICIÓN DE TERRENO DENOMINADO "TZOCUILAC" (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA ZOCUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	ZOCUILA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100.00%	100.00%	31139.00 m2	ACCION TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
TMP_PUE2 3030227125 2	186/23- 055	ADQUISICIÓN DE TERRENO DENOMINADO "SAN JOSÉ" (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA GOMEZ ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	GOMEZ	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100.00%	100.00%	10000 M2	ACCION TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
	186/23- 038	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA	LA UNION	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO EL ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.



 RECIBIDO
 13 OCT 2023
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Asesoría

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

		186/23-044	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALACINGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	JALACINGUITO	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ -	\$ -	\$ -	60.00%	0.00%	120.00 m2	LLEVA UN AVANCE DEL 60% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE NO HA COBRADO
--	--	------------	---	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	------	--------	-------	-----------	---



Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación Regional de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 ASISTENTE

RECIBIDO
 13 OCT 2023
 F123/SB/C/PE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contr atos	Proye ctos	Observaciones
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	541	5672573.96	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900			Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	392	246701	246701	57514	57514	57514	57514	57514			Impuestos y derechos (CONAGUA)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	311	9000000	9000000	5189093.48	5189093.48	5054099	5054099	5054099			Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	523	2000000	1524012.9	0	0	0	0	0			cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	441	8611653.64	9063409.83	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7469980.88	7469980.88			ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, tinacos, etc.)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	581	1500000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000			Terrenos (adquisicion de predios)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	614	1000000	1000000	0	0	0	0	0			División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	622	4000000	5436904.87	4076270.15	4076270.15	4076270.15	1370070.25	1370070.25			Edificación no habitacional (Rehabilitacion de espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	629	1500000	1500000	0	0	0	0	0			Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construccion de salon de usos multiples y techados comunitarios)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	272	1000000	1000000	0	0	0	0	0			Prendas de seguridad y proteccion personal
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	565	300000	300000	0	0	0	0	0			Equipo de comunicacion y telecomunicacion (adquisicion de radios)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	615	3050728.41	3050728.41	0	0	0	0	0			Construcción de vías de comunicación (Rehabilitacion de caminos)



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contr atos	Proye ctos	Observaciones
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	541	5672573.96	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900			Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	392	246701	246701	57514	57514	57514	57514	57514			Impuestos y derechos (CONAGUA)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	311	9000000	9000000	5189093.48	5189093.48	5054099	5054099	5054099			Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	523	2000000	1524012.9	0	0	0	0	0			cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	441	8611653.64	9063409.83	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7469980.88	7469980.88			ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, tinacos, etc.)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	581	1500000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000			Terrenos (adquisicion de predios)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	614	1000000	1000000	0	0	0	0	0			División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	622	4000000	5436904.87	4076270.15	4076270.15	4076270.15	1370070.25	1370070.25			Edificación no habitacional (Rehabilitacion de espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	629	1500000	1500000	0	0	0	0	0			Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construccion de salon de usos multiples y techados comunitarios)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	272	1000000	1000000	0	0	0	0	0			Prendas de seguridad y proteccion personal
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			1	565	300000	300000	0	0	0	0	0			Equipo de comunicacion y telecomunicacion (adquisicion de radios)
21	186	2	2023		33	I	5	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			2	615	3050728.41	3050728.41	0	0	0	0	0			Construcción de vías de comunicacion (Rehabilitacion de caminos)



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_ESTARIO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTERO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec	54,788.36	0												Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	0.00	0.00	0.00	Trabajos en acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Construcción y rehabilitación de parques públicos)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	24,763,687.88	31,380,420.43	31,380,420.43	31,380,420.43	20,184,012.65	20,184,012.65	20,184,012.65	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guarderías, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	2,635,500.00	2,635,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	4,595,436.09	8,180,530.13	8,180,530.13	8,180,530.13	4,317,500.79	4,317,500.79	4,317,500.79	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4,128,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	17,560,797.90	8,847,063.44	4,857,416.23	4,564,982.47	1,985,714.53	1,985,714.53	1,985,714.53	construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	13,306,779.44	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (infraestructura cultural y educativa; construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, espacios multideportivos, salón de usos múltiples, centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto corriente	531	Equipo médico y de laboratorio	2,321,174.39	2,321,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo médico y de laboratorio (cámara multisensorial y material ortopédico)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	12,344,819.44	12,344,819.44	12,344,819.44	4,610,831.37	4,610,831.37	4,610,831.37	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física	Validado
1-Programa presupuestario	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec	31,549.30	0												Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec			Gasto de Inversión	581	Terrenos	1,500,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Terrenos (adquisición de predios)	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	4,000,000.00	5,436,904.87	4,076,270.15	4,076,270.15	4,076,270.15	1,370,070.25	1,370,070.25	Edificación no habitacional (Rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)	Validado	
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto de Inversión	629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salón de usos múltiples y techados comunitarios)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	3,050,728.41	3,050,728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,200,000.00	2,200,000.00	1,495,853.21	1,495,853.21	1,495,853.21	1,495,853.21	1,495,853.21	1,495,853.21	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	272	Prendas de seguridad y protección personal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Prendas de seguridad y protección personal	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	392	Impuestos y derechos	246,701.00	246,701.00	57,514.00	57,514.00	57,514.00	57,514.00	57,514.00	57,514.00	Impuestos y derechos (CONAGUA)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	523	Cámaras fotográficas y de video	2,000,000.00	1,524,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	311	Energía eléctrica	9,000,000.00	9,000,000.00	5,189,093.48	5,189,093.48	5,054,099.00	5,054,099.00	5,054,099.00	5,054,099.00	Energía eléctrica (pago de alumbrado publico)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto de Inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	5,672,573.96	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos Y equipamiento para servicio publico municipal)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	8,611,653.64	9,063,409.83	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	7,469,980.88	7,469,980.88	7,469,980.88	ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, tinacos, etc.)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	565	Equipo de comunicación y telecomunicación	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de comunicación y telecomunicacion (adquisición de radios)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	853	Otros convenios	2,466,857.40	2,466,857.40	2,466,857.40	2,466,857.40	2,466,857.40	2,466,857.40	2,466,857.40	2,466,857.40	Otros Convenios (aportación al cesero)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	5,875,962.88	6,675,962.88	6,675,962.88	6,675,962.88	3,685,791.98	3,685,791.98	3,685,791.98	3,685,791.98	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad pública)	Validado
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlaltlauquitepec		Gasto corriente	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	912,670.71	912,670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Agüinaldo o gratificación de fin de año (agüinaldos de elementos de seguridad pública)	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_ESTADISTICO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2023	3	21	Puebla	186	Tlatlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Tlatlauquitepec		Gasto de inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)	Validado




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	3	PUE230302248421	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000 AL 0 MAS165.00 EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154204	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ajocotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154204	55	55	0	Metros Cuadrados	834.6	21/07/2023	15/09/2023	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	496,980.10	496,980.10	496,980.10	Validado avances
2023	3	PUE230202226278	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILAPA EN LA COMUNIDAD DE JILAPA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 210.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. PRIMERA ETAPA - 97606	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Atalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	97606	164	163	0	Metros Cuadrados	1260	16/05/2023	14/08/2023	1,716,239.24	1,542,790.50	1,542,790.50	1,542,790.50	1,542,790.50	1,542,790.50	Validado avances
2023	3	PUE230202220364	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 400 M. DE LONGITUD DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 PRIMERA ETAPA - 48713	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chicuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	48713	38	37	0	Metros Cuadrados	712	15/04/2023	13/07/2023	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	Validado avances
2023	3	PUE230202225498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 117056	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chinampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	117056	25	25	0	Metros Cuadrados	780	27/06/2023	26/07/2023	997,614.15	997,614.15	997,614.15	997,614.15	997,614.15	997,614.15	Validado avances
2023	3	PUE230302248349	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL ZOPILCOLOC UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 153745	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	153745	4524	4523	0	Piezas	4	21/07/2023	08/09/2023	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230302258460	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ASERRADERO A ATALPA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ATALPA PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 214209	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	214209	50	50	0	Metros Cuadrados	714	20/09/2023	28/11/2023	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230202226317	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 97962	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	97962	750	750	0	Piezas	246	16/05/2023	14/07/2023	808,741.63	808,741.63	808,741.63	808,741.63	808,741.63	808,741.63	Validado avances
2023	3	PUE230202225861	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 944.00 EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 94246	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	94246	55	55	0	Metros Cuadrados	938.6	16/05/2023	14/07/2023	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	Validado avances
2023	3	PUE230202228844	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 00 AL 0 MAS 120 DEL KM 0 MAS135.50 AL 0 MAS 185.50 Y DEL KM 0 MAS 347 AL 0 MAS 397 EN LA LOCALIDAD DE CUACUALXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114026	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Cuacualxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	114026	70	70	0	Metros Cuadrados	880	20/06/2023	18/08/2023	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	686,294.94	686,294.94	686,294.94	Validado avances
2023	3	PUE230202225998	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26 MAS 101.00 KM EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. 95346	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	95346	750	750	0	Metros Cuadrados	7841.2	23/05/2023	21/07/2023	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	Validado avances
2023	3	PUE230302258479	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN LOCALIDAD DE GÓMEZ SUR MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 214284	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	214284	75	75	0	Piezas	19	13/09/2023	11/12/2023	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230202228906	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114671	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	114671	83	82	0	Metros Cuadrados	140.4	21/06/2023	21/08/2023	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	Validado avances
2023	3	PUE230202227469	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 105549	Puebla	186	Tlatlauquitepec	La Primavera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	105549	21	20	0	Metros Cuadrados	48	09/06/2023	07/08/2023	598,280.15	598,280.15	598,280.15	598,280.15	598,280.15	598,280.15	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	3	PUE230302261241	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 218.83 EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 231258	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	231258	50	50	0	Metros Cuadrados	1618.68	01/09/2023	15/12/2023	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230202220415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 0 MAS 200.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 49050	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	49050	53	52	0	Metros Cuadrados	1204	18/04/2023	17/07/2023	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	Validado avances
2023	3	PUE230302248305	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 153474	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	153474	35	35	0	Metros lineales	189	21/07/2023	04/09/2023	240,422.93	240,422.93	240,422.93	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230202228586	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO MÉXICO 68 CON CLAVE 21EBH0471P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 112303	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	112303	60	60	0	Metros Cuadrados	587.18	20/06/2023	18/09/2023	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	876,484.82	876,484.82	876,484.82	Validado avances
2023	3	PUE230302257907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 211273	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	211273	67	68	0	Kilómetro	2350	01/09/2023	20/10/2023	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230102208000	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERERAL ACAJETE TEZUITLAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 17209	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	17209	415	415	0	Metros Cuadrados	1112.4	03/04/2023	03/07/2023	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	Validado avances
2023	3	PUE230302258455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DTV01235 EN LA COMUNIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 214187	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	214187	77	77	0	Metros Cuadrados	693	13/09/2023	11/12/2023	2,323,254.19	2,323,254.19	2,323,254.19	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230302251243	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 193.00 KM EN LA LOCALIDAD DE PABLOGCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170079	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pablogco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	170079	50	50	0	Metros cúbicos	954.4	21/07/2023	18/09/2023	852,469.24	852,469.24	852,469.24	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230302262142	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 236020	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	236020	50	50	0	Metros Cuadrados	900	20/09/2023	17/11/2023	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2023	3	PUE230202227640	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 106667	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlatlauquitepec	106667	85	86	0	Metros Cuadrados	576	09/06/2023	07/08/2023	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	Validado avances
2023	3	PUE230202228497	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA - 111767	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	111767	75	75	0	Metros Cuadrados	1213.16	20/06/2023	18/08/2023	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	Validado avances




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	3	PUE230302251362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO QUETZALCOATL CON CLAVE 21EBH0307P DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170849	Puebla	186	Tlatlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	170849	89	88	0	Metros Cuadrados	551.32	25/07/2023	23/10/2023	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2023	3	PUE230302258464	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 6 MAS 600.00 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 214217	Puebla	186	Tlatlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	214217	50	50	0	Metros cúbicos	955.29	20/09/2023	18/12/2023	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2023	3	PUE230302253720	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 180.00 EN LA LOCALIDAD DE TANHUJICO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 183731	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tanhujico del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	183731	48	47	0	Metros Cuadrados	1080	09/08/2023	18/09/2023	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,424,159.26	1,424,159.26	1,424,159.26	Validado avances	
2023	3	PUE230302248142	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 152679	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tatauzoquico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	152679	100	100	0	Metros Cuadrados	483.71	17/07/2023	30/08/2023	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	Validado avances	
2023	3	PUE230302257933	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 250 M DE LONGITUD DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 0 MAS 250.00 - 211375	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tehuagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	211375	60	60	0	Metros Cuadrados	1250	01/09/2023	29/11/2023	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2023	3	PUE230302248640	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 420 EN LA LOCALIDAD DE TEPHECAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 155688	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tephecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	155688	100	100	0	Metros cúbicos	696.93	22/07/2023	10/08/2023	544,915.70	544,915.70	544,915.70	544,915.70	544,915.70	544,915.70	Validado avances	
2023	3	PUE230302248450	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO TOCHIMPA DE 260 M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. 2DA ETAPA - 154312	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tochimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154312	255	255	0	Metros Cuadrados	590.5	21/07/2023	09/10/2023	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	729,567.45	729,567.45	729,567.45	Validado avances	
2023	3	PUE230202228674	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 695.65 EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 113083	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Túnel Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	113083	105	105	0	Metros Cuadrados	1620	13/06/2023	11/08/2023	2,107,232.47	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	Validado avances
2023	3	PUE230302250667	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZAPATA CALLE HERNANDEZ CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 167230	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tzincuilapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	167230	43	42	0	Piezas	19	30/07/2023	14/11/2023	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,176,972.90	1,176,972.90	1,176,972.90	Validado avances	
2023	3	PUE230302248484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE XALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154507	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154507	50	50	0	Metros Cuadrados	825	21/07/2023	15/09/2023	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	582,817.96	582,817.96	582,817.96	Validado avances	
2023	3	PUE230302251292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEODOMIRO MÉNDEZ XOPANACO EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170360	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	170360	108	107	0	Metros Cuadrados	840	02/08/2023	08/09/2023	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	0.00	0.00	0.00	Validado avances	

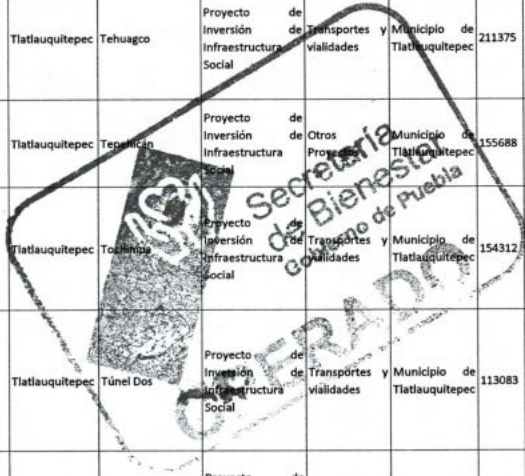

DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	3	PUE230302251445	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CON CLAVE 21DPR35350 UBICA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 171321	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	171321	132	132	0	Metros Cuadrados	614.81	25/07/2023	02/10/2023	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	544,232.63	544,232.63	544,232.63	Validado avances
2023	3	PUE230302271677	33	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	186/23-038	0	0	51495	Metros Cuadrados	246.63	15/09/2023	13/12/2023	1,156,200.06	1,156,200.06	1,156,200.06	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302271685	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALACINGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	186/23-044	0	0	128	Metros Cuadrados	246.63	20/09/2023	18/12/2023	1,549,999.84	1,549,999.84	1,549,999.84	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230202232950	33	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlatlauquitepec	186/23-009	0	0	200	Calentador(es)	200	05/05/2023	03/07/2023	1,903,000.88	1,903,000.88	1,903,000.88	1,903,000.88	1,903,000.88	1,903,000.88	Validado avances
2023	3	PUE230202232252	33	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (RELACIONES EXTERIORES) EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y Turismo	Municipio de Tlatlauquitepec	186/23-033	0	0	9358	Metros Cuadrados	137.53	03/07/2023	28/09/2023	1,370,070.25	1,370,070.25	1,370,070.25	1,370,070.25	1,370,070.25	1,370,070.25	Validado avances
2023	3	PUE230302271246	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO DENOMINADO (TZOCUILAC) (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE ZOCUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	186/23-056	0	0	400	Metros Cuadrados	31139	01/08/2023	31/08/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302271252	33	FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE TERRENO DENOMINADO "SAN JOSÉ" (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA GOMEZ ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Oriente	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	186/23-055	0	0	1258	Metros Cuadrados	10000	01/08/2023	31/08/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado / Registrado avances

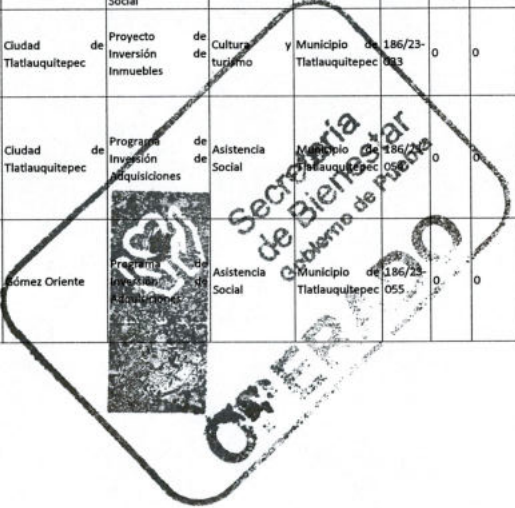

INDICADORES

TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	3	3	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	{just1:{ciclo:2023,trim:3,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsanchez,fecha:12/10/23}}	0	100	Validado
2023	3	3	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	34.09091	34.09091	{just1:{ciclo:2023,trim:3,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsanchez,fecha:12/10/23}}	39.02439	114.47	Validado
2023	3	3	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	65.90909	65.90909	{just1:{ciclo:2023,trim:3,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsanchez,fecha:12/10/23}}	60.97561	108.09	Validado
2023	3	3	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:3,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsanchez,fecha:13/10/23}}	53.83381	80.75	Validado
2023	3	3	Puebla	Tlaltlauquitepec	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667		66.66667	100	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo			
2023	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE ESTE RUBRO, YA QUE, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, SE DARÁ PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	0	Otras causas	100	Validado			
2023	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de contribución directa de proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	34.09091	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 52 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYA A MEJORAR DE MANERA INMEDIATA LAS CARENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEA EJECUTAR 52 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYA A MEJORAR DE MANERA INMEDIATA LAS CARENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN 52 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYA A MEJORAR DE MANERA INMEDIATA LAS CARENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN 52 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYA A MEJORAR DE MANERA INMEDIATA LAS CARENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL	34.09091	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN SUPERAR LA META PLANEADA DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, YA QUE DE LAS 15 PLANEADAS SE LOGRARON EJECUTAR 16 ENTRE ELLAS, CAMINOS SACA COSÉCHAS, ELECTRIFICACIONES, DRENAJES Y TECHUMBRES EN ESPACIOS MULTIDIMENSIONALES	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN SUPERAR LA META PLANEADA DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, YA QUE DE LAS 15 PLANEADAS SE LOGRARON EJECUTAR 16 ENTRE ELLAS, CAMINOS SACA COSÉCHAS, ELECTRIFICACIONES, DRENAJES Y TECHUMBRES EN ESPACIOS MULTIDIMENSIONALES	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN SUPERAR LA META PLANEADA DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, YA QUE DE LAS 15 PLANEADAS SE LOGRARON EJECUTAR 16 ENTRE ELLAS, CAMINOS SACA COSÉCHAS, ELECTRIFICACIONES, DRENAJES Y TECHUMBRES EN ESPACIOS MULTIDIMENSIONALES	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN SUPERAR LA META PLANEADA DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN, YA QUE DE LAS 15 PLANEADAS SE LOGRARON EJECUTAR 16 ENTRE ELLAS, CAMINOS SACA COSÉCHAS, ELECTRIFICACIONES, DRENAJES Y TECHUMBRES EN ESPACIOS MULTIDIMENSIONALES	39.02439	Otras causas	114.47	Validado

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	3	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	65.90909	{just1: {ciclo: 2023, trim: 3, just: Otras causas, usuario: gilbertosanchez, fecha: 12/10/23}}	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN EJECUTAR 29 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS INDICADORES DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO	65.90909	{just1: {ciclo: 2023, trim: 3, just: Otras causas, usuario: gilbertosanchez, fecha: 12/10/23}}	EN ESTE TRIMESTRE SE PLANEAN EJECUTAR 29 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS INDICADORES DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO	60.97561	Otras causas	ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES. CABE MENCIONAR QUE DE LOS 25 PROYECTOS REGISTRADOS	108.09	Validado

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	436 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.6667	(Just1: {ciclo: 2023, trim: 3, usuario: Otras causas, usuario: glibartodanched, fecha: 13/10/23})	AL TERCER TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$ 32,891,452.00 EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASI COMO PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66.6667	(Just1: {ciclo: 2023, trim: 3, usuario: Otras causas, usuario: glibartodanched, fecha: 13/10/23})	AL TERCER TRIMESTRE SE PLANEA EJERCER \$ 32,891,452.00 EN ACCIONES TALES COMO PAGO DE LUZ, RELLENO, CONVENIO DE CERESO, PAGO DE CONAGUA ASI COMO PROYECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	59.83981	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, LA APORTACIÓN AL CERESO, PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, ACCIONES COMO FERTILIZANTES APOYOS A AGRICULTORES Y ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, APOYOS ESCOLARES Y LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR, PAGO DE SUELDOS A POLICÍAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, TENEMOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN PAGO DE SUELDOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN PAGO DE SUELDOS JULIO A SEPTIEMBRE, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y UN CONVENIO CON EL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MOTIVO, SE ESTÁ RESERVANDO EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO UNA VEZ OBTENIDAS LAS OPINIONES FAVORABLES POR PARTE DE CONSEJO ESTATAL DE VINCLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	80.75	Validado
2023	3	Puebla	Tlaxiahuac	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	436 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.6667	(Just1: {ciclo: 2023, trim: 3, usuario: Otras causas, usuario: glibartodanched, fecha: 13/10/23})	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 66.67 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	66.6667	(Just1: {ciclo: 2023, trim: 3, usuario: Otras causas, usuario: glibartodanched, fecha: 13/10/23})	A ESTE TRIMESTRE SE PLANEA ALCANZAR EL 66.67 % DEL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS; YA QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	66.6667	Otras causas	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA, SE CONSTRUYERON LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES PARA BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACION EN GENERAL, TAMBIEN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EL PAGO DE SUELDOS DE JULIO A SEPTIEMBRE ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EN TRÁMITE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL	100	Validado
