



**TLATLAUQUITEPEC**  
GOBIERNO DE CONTINUIDAD 2021-2024  
*usos, costumbres y tradiciones*



Tlatlauquitepec, Puebla a 15 de enero del 2024  
Dependencia: Presidencia Municipal  
Área: Obras Públicas  
Oficio: MTP/DOP/01/047/2024  
Asunto: Validación de folios

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**usos, costumbres y tradiciones**  
ATENTAMENTE


**LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	8,222,858.00	49,337,148.00	16.67	8,222,858.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, LUZ, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO A RELLENO SANITARIO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE
	2do. Trimestre	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA
	3er. Trimestre	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN; LOS RECURSOS SE HAN PROYECTADO DISTRIBUIR EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA, SE CONSTRUYERON LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES PARA BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACION EN GENERAL, TAMBIEN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EL PAGO DE SUELDOS DE JULIO A SEPTIEMBRE ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EN TRÁMITE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL
	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN YA QUE EL MUNICIPIO HA DESTINADO LOS RECURSOS QUE SE HAN PROYECTADO EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y APORTACIÓN PARA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA, SE CONSTRUYERON LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES PARA BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE CAMINOS, PAVIMENTOS, ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA, ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS
								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN YA QUE EL MUNICIPIO HA DESTINADO LOS RECURSOS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PARA GASTO DE INVERSIÓN
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES 2023**



**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	2.52	1,244,737.00	49,337,148.00	2.52	1,244,737.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SOLO SE REALIZÓ EL PAGO EL ALUMBRADO PÚBLICO, YA QUE EL CONVENIO DE PAGO DE RELLENO SANITARIO, TUVO MODIFICACIONES EN ALGUNAS CLÁUSULAS, POR LO QUE NO SE REQUISITO DE MANERA CORRECTA PARA PAGO; LA CARTA MANDATO PARA EL PAGO DE CERESO NOS FUE REMITIDA EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL, PARA EL PAGO DE CONAGUA, SE AGREGO UN NUEVO SERVICIO Y SE ESTÁ DANDO DE ALTA EN SISTEMA PARA REALIZAR EL PAGO, Y LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE TUBO EL PRIMER PAGO EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL
	2do. Trimestre	41.67	20,557,145.00	49,337,148.00	27.56	13,596,896.73	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE A REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, RELLENO SANITARIO, LA APORTACION AL CERESO, PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, ACCIONES COMO FERTILIZANTES Y ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, Y LA ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR
	3er. Trimestre	66.67	32,891,432.00	49,337,148.00	53.83	26,560,066.72	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE A REALIZADO EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, LA APORTACIÓN AL CERESO, PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, ACCIONES COMO FERTILIZANTES APOYOS A AGRICULTORES Y ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, APOYOS ESCOLARES Y LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR, PAGO DE SUELDOS A POLICÍAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, TENEMOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN PAGO DE SUELDOS JULIO A SEPTIEMBRE, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y UN CONVENIO CON EL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MOTIVO, SE ESTÁ RESERVANDO EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO UNA VEZ OBTENIDAS LAS OPINIONES FAVORABLES POR PARTE DE CONSEJO ESTATAL DE VINCULACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
	4to. Trimestre	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00	100.00	49,337,148.00	49,337,148.00	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN YA QUE EL MUNICIPIO HA DESTINADO LOS RECURSOS QUE SE HAN PROYECTADO EN GASTO CORRIENTE COMO PAGO DE AGUA, PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RELLENO SANITARIO, PAGO DE CONVENIO AL CERESO, PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y APORTACIÓN PARA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL, APOYOS SOCIALES AL SECTOR RURAL, EDUCATIVO Y VIVIENDA, SE CONSTRUYERON LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES PARA BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE CAMINOS, PAVIMENTOS, ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA, ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS

GOBIERNO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 15 ENE 2024  
 RECIBIDO  
 F/42/SB/ICGPSE

**Índice de Dependencia Financiera**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	2do. Trimestre	2.39	20,557,145.00	8,613,842.00	1.98	20,557,145.00	10,369,684.89	A ESTE TRIMESTRE SE REPORTA LOS INGRESOS PROPIOS CAPTURADOS HASTA LA FECHA DE ACUERDO AL OFICIO Nº TES/695/06/2023 EMITIDO POR EL AREA DE TESORERIA, EN LA CUAL HACEN DE CONOCIMIENTO QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION CONTABLE AL MES DE JUNIO




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES 2023**



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	4to. Trimestre	2.86	49,337,148.00	17,227,685.00	0.24	49,337,148.00	203,668,249.00	A ESTE TRIMESTRE EL MUNICIPIO REPORTA LOS INGRESOS PROPIOS CAPTURADOS HASTA NOVIEMBRE EN RESPUESTA A LA CONTESTACIÓN AL OFICIO N.º MTP/DOP/12/2556/2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS A LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CUAL SE SOLICITÓ EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA REALIZAR LA CAPTURA DEL 4TO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2023 EN LA PLATAFORMA DEL SRFT. EN EL NIVEL INDICADORES POR LO QUE CON FECHA 9 DE ENERO DE 2024, ENTREGAN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EL DATO CORRESPONDIENTE A \$203,668,249.62 INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023, YA QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN EXACTA A DICIEMBRE.
--	----------------	------	---------------	---------------	------	---------------	----------------	--



Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	0.01	214,022,843.00	213,995,842.00	5.48	225,727,540.94	213,995,842.00	A ESTE TRIMESTRE EL MUNICIPIO REPORTA LOS INGRESOS PROPIOS CAPTURADOS HASTA NOVIEMBRE EN RESPUESTA A LA CONTESTACIÓN AL OFICIO N.º MTP/DOP/12/2556/2023 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS A LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN LA CUAL SE SOLICITÓ EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA REALIZAR LA CAPTURA DEL 4TO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2023 EN LA PLATAFORMA DEL SRFT. EN EL NIVEL INDICADORES POR LO QUE CON FECHA 9 DE ENERO DE 2024, ENTREGAN AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EL DATO CORRESPONDIENTE A \$203,668,249.62 INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023, YA QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN EXACTA A DICIEMBRE.



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 2023




FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)


Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO			ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	19	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	3er. Trimestre	0.00	0	44	0.00	0	41	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
	4to. Trimestre	1.92	1	52	0.00	0	56	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTA NINGUNA OBRA DE ESTE RUBRO, YA QUE DE ACUERDO A LA PLANEACION, SE DARA PRIORIDAD A OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO			ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR UNA OBRA CORRESPONDIENTE A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	35.00	7	20	31.58	6	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR, LA META PLANEADA, YA QUE DE LAS 7 PLANEADAS SOLO SE ENCUENTRAN EN PROCESO 6 OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	34.09	15	44	39.02	16	41	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRAN EJECUTAR 16 ENTRE ELAS, CAMINOS SACA COSECHAS, ELECTRIFICACIONES, DRENAJES Y TECHUMBRES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS
	4to. Trimestre	36.54	19	52	42.86	24	56	A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA SUPERAR LA META PLANEADA YA QUE DE LAS 19 OBRAS PLANEADAS SE EJECUTARON 24 OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA YA QUE EL MUNICIPIO INVIRTIÓ EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ELECTRIFICACIONES, DRENAJE Y CAMINOS MEJORANDO CONSIDERABLEMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN DIVERSAS COMUNIDADES
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO			ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	75.00	3	4	75.00	3	4	EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EJECUTAR 3 OBRAS CORRESPONDIENTES A ESTE RUBRO, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	65.00	13	20	68.42	13	19	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR, LA META PLANEADA, YA QUE DE LAS 20 PLANEADAS SOLO SE ENCUENTRAN EN PROCESO 19 OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, YA QUE VARIOS PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	65.91	29	44	60.98	25	41	A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA YA QUE DE LOS 39 PROYECTOS PLANEADOS SOLO SE LOGRAN 25, YA QUE LOS DEMAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
	4to. Trimestre	61.54	32	52	57.14	32	56	CABE MENCIONAR QUE DE LOS 25 PROYECTOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA MIDS SOLO UN PROYECTO NO MIGRO EL CUAL CORRESPONDE AL FOLIO 211346 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION NORTE, EN LA COMUNIDAD DE MECAYUCAN DEL C.A.D. 0-000 ALCADJ 0-110.00, PERTENECE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.



Entidad Municipal	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Clave de Ramo	Modo de Asignación	Programa	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Re Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont. Proy. ratios exactos	Observaciones		
21	186	1	2023	2	33	1	4	FAIS Municipal	1	166862.22	0	2	612	13306779.44	0	0	0	0	Edificación no habitacional (infraestructura cultural y educativa; construcción de aulas, dirección y módulos, techados en áreas de impartición de educación física, canchas, cercados perimetrales, espacios multideportivos, salón de usos múltiples, centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)	
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	613	17560797.9	6395419.95	6395419.95	6395419.95	6395419.95	6395419.95	4394486.83		construcción de obras para el abastecimiento de agua y electricidad (construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación energía eléctrica, agua potable y drenaje)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	614	24763687.88	38593366.1	38593366.1	38593366.1	38593366.1	38593366.1	28496885.08		División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: guardiones, banquetas, pavimentos en vialidades del municipio)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	615	4595436.09	13358174.86	13358174.86	13358174.86	13358174.86	13358174.86	7328060.89		Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y/o mantenimiento de carreteras y terracerías)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	622	2635500	0	0	0	0	0	0		Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	626	4128232.3	0	0	0	0	0	0		Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	1	441	3020000	0	0	0	0	0	0		Ayudas sociales a personas (VIVIENDA)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	1	531	2321174.39	0	0	0	0	0	0		Equipo médico y de laboratorio (camara multisensorial y material ortopédico)		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	629	0	14551169.12	14551169.12	14551169.12	14551169.12	14551169.12	11234436.83		Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física		
21	186	2	2023	33	1	4	FAIS Municipal	2	616	0	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	1102100.17	0		Trabajos en acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Construcción y rehabilitación de parques públicos)		
21	186	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN Municipal	1	113	375289.07	0	1	113	5875962.88	8129490.89	8129490.89	8129490.89	5860495.91	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad pública)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Municipal	1	132	912670.71	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	1278982.63	0		Aguiñaldo o gratificación de fin de año (aguiñaldos de elementos de seguridad pública)		
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Municipal	1	853	2466857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4	4966857.4		Otros Convenios (aportación a fondo)		
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Municipal	1	358	2200000	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45	2162610.45		Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de rellevo sanitario)		



Entidad Municipal	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Recurso	Modo de Asignación	Programa	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Re Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cont. Proy. ratios	Observaciones
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	2	541	5672573.96	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	2759900	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos y equipamiento para servicio público municipal)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	1	392	246701	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	115028	Impuestos y derechos (CONAGUA)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	1	311	9000000	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	7829331	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	1	523	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	cámaras fotográficas y de video (adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	1	441	8611653.64	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	7969980.88	ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, tinacos, etc.)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	2	581	1500000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	Terrenos (adquisición de predios)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	2	614	1000000	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	3198875.77	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	2	622	4000000	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	8169528.85	4491964.34	4491964.34	Edificación no habitacional (rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	2	629	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salón de usos múltiples y techados comunitarios)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	1	272	1000000	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	931851.2	0	0	Prendas de seguridad y protección personal
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	1	565	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios)
21	186	2	2023	33	1	5	FORTAMUN Tlatlaquepec	2	615	3050728.41	0	0	0	0	0	0	0	0	Construcción de vías de comunicación (rehabilitación de caminos)





TLATLAUQUITEPEC  
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC  
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

FOLO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
289755	186/23-016	186/23-016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, DEL KM 0+000 AL KM 0+195, INTERSECCIÓN CON AV. FERRICARRIL, EN LA LOCALIDAD DE ATIOYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	ATIOYAN	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ -	100.00%	0.00%	1072.1 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230302 251243	170079	186/23-022	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL 1+193.00 KM. EN LA LOCALIDAD DE PABLOGO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	PABLOGO	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ 852,469.24	\$ -	100.00%	0.00%	954.40 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%, SU ESTIMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA.
PUE230302 258479	214284	186/23-023	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTIN, LOCALIDAD GÓMEZ SUR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	GÓMEZ SUR	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,753,321.47	\$ 1,582,825.83	90.27%	100.00%	19 PIEZAS	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO \$525,996.44 MÁS EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1, \$668,679.59 Y UNA ESTIMACIÓN 2, \$498,298.50 EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE \$ 1,582,825.83
PUE230302 248305	153474	186/23-028	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	\$ 240,422.93	100.00%	100.00%	189.00 ML	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
Subsecretaría General de Evaluación, Seguimiento y Transparencia  
15 ENE 2024





MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



PUE230202 228844	114026	186/23-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+00 AL 0+120, DEL KM 0+135.50 AL 0+185.50 Y DEL KM 0+347 AL 0+397, EN LA LOCALIDAD DE CUACUALXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUACUALXTLA	\$ 1,101,140.68	\$ 1,101,140.68	\$ 1,101,140.68	\$ 1,101,140.68	100.00%	100.00%	880.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACION
PUE230202 228586	112303	186/23-031	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO "MÉXICO 68" CON CLAVE 21E8H071P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$ 2,190,485.41	\$ 2,190,485.41	\$ 2,190,485.41	\$ 2,190,485.41	100.00%	100.00%	587.18 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACION
PUE230302 248349	153745	186/23-032	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL ZÓPILCO, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)	TLATLAUQUITEPEC	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	\$ 1,102,100.17	0.00%	100.00%	4 PIEZAS	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO. SU ESTIMACION DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230302 248484	154507	186/23-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XACUINCO - TOCHIMPA, DE 260 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. 2DA ETAPA	XACUINCO	\$ 1,034,384.34	\$ 1,034,384.34	\$ 1,034,384.34	\$ 1,034,384.34	100.00%	100.00%	590.50 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACION

RECIBIDO  
 F42/SR/CGP/PE  
 15 ENE 2024  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente



TLATLAUQUITEPEC  
Municipio de Tlaxiaco

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA Mágico

PUE230302 251292	170960	186/23- 035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODOMIRO MÉNDEZ (XOPANACO), EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 1,013,879.46	\$ 1,013,879.46	\$ 1,013,879.46	\$ 1,013,879.46	100.00%	100.00%	840.00 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 251362	170949	186/23- 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO "QUETZALCOATL" - CON CLAVE SAN AGUSTÍN 21BIB98079, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN	\$ 2,230,751.10	\$ 2,230,751.10	\$ 2,230,751.10	\$ 2,230,751.10	100.00%	100.00%	551.32 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 251445	171321	186/23- 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO" - CON CLAVE 21DPR3530, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	XONOCUAUTLA	\$ 2,410,214.82	\$ 2,410,214.82	\$ 2,410,214.82	\$ 2,410,214.82	100.00%	100.00%	614.81 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230402 248421	154204	186/23- 040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION NORTE, EN LA COMUNIDAD DE MECAYUCAN DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+1000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	MECAYUCAN	\$ 1,001,724.75	\$ 1,001,724.75	\$ 1,001,724.75	\$ 1,001,724.75	100.00%	100.00%	579.15 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 248421	154204	186/23- 041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+165.00, EN LA LOCALIDAD DE AJOCTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	AJOCTZINGO	\$ 1,251,564.79	\$ 1,251,564.79	\$ 1,251,564.79	\$ 1,251,564.79	100.00%	100.00%	834.60 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

RECIBIDO  
FM/23/SE/CGPSE  
15 ENE 2024  
SECRETARIA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planificación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente  
Gobierno de Puebla  
Mesa Honoraria



TLATLAUQUITEPEC  
www.tlaxiaco.gob.mx

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA MÉGICO

PUE230302 257933	211375	186/23- 042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACCO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. DE 250 M DE LONGITUD, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+250.00	TERHUACCO	\$	1,525,942.17	\$	1,525,942.17	\$	1,525,942.17	\$	1,525,942.17	\$	1,525,942.17	100.00%	100.00%	1250.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 248484	154507	186/23- 043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE XALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	XALTENANGO	\$	1,096,448.04	\$	1,096,448.04	\$	1,096,448.04	\$	1,096,448.04	\$	1,096,448.04	100.00%	100.00%	825.00 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 258455	214187	186/23- 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CON CLAVE 21D1V01235, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	OYAMELES	\$	2,323,254.19	\$	2,323,254.19	\$	2,323,254.19	\$	2,323,254.19	\$	2,323,254.19	52.20%	93.80%	650 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO Y HA COBRADO UNA ESTIMACIÓN \$1,212,871.57 LLEVA UN AVANCE FÍSICAMENTE DE 95%
PUE230302 250667	167230	186/23- 046	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZAFATA, CALLE HERNÁNDEZ, CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TZINCUILAPAN	\$	1,762,496.44	\$	1,762,496.44	\$	1,762,496.44	\$	1,762,496.44	\$	1,762,496.44	100.00%	100.00%	19 piezas	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 253720	183731	186/23- 047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+180.00, EN LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TANHUIXCO DEL CARMEN	\$	1,626,305.11	\$	1,626,305.11	\$	1,626,305.11	\$	1,626,305.11	\$	1,626,305.11	100.00%	100.00%	1080.00 m2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 257907	211273	186/23- 049	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT - PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	OCOTLÁN DE BETANCOURT	\$	1,589,870.61	\$	1,589,870.61	\$	1,589,870.61	\$	1,589,870.61	\$	1,589,870.61	100.00%	100.00%	2350 KM	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

RECIBIDO  
5 ENE 2024  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Gobierno de Puebla  
Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MEXICO

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA MEXICO

PUE230302 258460	214209	186/23- 051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ASERADERO A ATALPA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+250.00, EN LA LOCALIDAD DE ATALPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	ATALPA	\$ 1,015,819.73 \$	\$ 1,015,819.73 \$	\$ 1,015,819.73 \$	\$ 1,015,819.73 \$	\$ 1,015,819.73 \$	100.00%	0.00%	714.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SE HA PAGADO ANTECIPU, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN, SU DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO POR EL ÁREA CONTABLE
PUE230302 258464	214217	186/23- 058	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 6+600.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAGGHALTZIN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	SAN AGUSTIN CHAGGHALTZIN	\$ 1,420,689.49 \$	\$ 1,420,689.49 \$	\$ 1,420,689.49 \$	\$ 1,420,689.49 \$	\$ 1,420,689.49 \$	100.00%	100.00%	955.29 M3	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
PUE230302 261241	231258	186/23- 059	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DIAZ DEL KM 0+000.00 AL 0+218.83, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	MAZATEPEC	\$ 1,850,202.76 \$	\$ 1,850,202.76 \$	\$ 1,850,202.76 \$	\$ 1,850,202.76 \$	\$ 1,850,202.76 \$	100.00%	0.00%	1618.68 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO HA PAGADO ANTECIPU, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230402 289930	307472	186/23- 060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEPERICAN-HUAXTLA DEL KM 0+307.00 AL KM 0+507.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	HUAXTLA	\$ 1,416,174.75 \$	\$ 1,416,174.75 \$	\$ 1,416,174.75 \$	\$ 1,416,174.75 \$	\$ 1,416,174.75 \$	31.58%	0.00%	300 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO YA SE HA PAGADO ANTECIPU, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN.
PUE230302 262142	236020	186/23- 061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	PEZMATLAN	\$ 1,187,815.66 \$	\$ 1,187,815.66 \$	\$ 1,187,815.66 \$	\$ 1,187,815.66 \$	\$ 1,187,815.66 \$	100.00%	100.00%	900.00 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN

RECIBIDO  
FISCOSIOPGSE  
15 ENE 2024  
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
Dirección General de Planeación y Seguimiento  
Dirección de Planeación y Seguimiento



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL

PUE230402 295638	332775	186/23- 062	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM0 +000.00 AL 2+280.00 EN LA LOCALIDAD DE CUATLAMINGO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	CUATLAMINGO	\$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	999,502.56 \$	100.00%	0.00%	1545 M3	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SE HA PAGADO ANTECIPU, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN, SU DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO POR EL ÁREA CONTABLE
PUE230402 297120	338474	186/23- 065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE ILITA - PEZMATLAN, DE LA LOCALIDAD DE ILITA Y PEZMATLAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	ILITA	\$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	1,119,840.60 \$	36.36%	0.00%	200.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTECIPU	
PUE230402 287179	293586	186/23- 066	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LOC. GÓMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	GÓMEZ PONIENTE	\$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	969,301.83 \$	100.00%	0.00%	9 PIEZAS	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA, SOLO FALTA LA CONEXIÓN DE CFE, YA SE HA PAGADO ANTECIPU, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN.	
PUE230402 2287093	293198	186/23- 067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, DEL KM 0+000 AL KM 0+160 EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (CONSTRUCCIÓN)	GÓMEZ PONIENTE	\$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	1,182,717.42 \$	84.54%	57.70%	828.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO YA SE HA PAGADO ANTECIPU, Y UNA ESTIMACIÓN 1 \$477,729.31, EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN.	
PUE230402 298530	290589	186/23- 068	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE EL LIBRAMIENTO MIGUEL GUERRERO ORTIZ Y LIBERTADORES DE AMERICA DEL CADENAMIENTO KM 0+000.00 AL 0+692.31, EN LA LOCALIDAD DE TETEPENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	ANALCO	\$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	711,016.70 \$	100.00%	100.00%	557.37 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACION	
PUE230402 298576	344165	186/23- 070	EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA "ANTONIO CASO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21D70V018A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETEPENO DE ITORBI, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	TETEPENO	\$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	2,206,349.68 \$	33.48%	0.00%	200.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO ANTECIPU, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTECIPU EN CADA ESTIMACIÓN.	

RECIBIDO  
15 ENE 2024  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
GOBIERNO MUNICIPAL  
EVALUACIÓN DE BIENESTAR  
MUNICIPIO DE Tlatlauquitepec, Puebla



TLATLAUQUITEPEC  
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
CUARTO TRIMESTRE 2023



TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA MEXICO

PUE23040 2301773	356792	186/23- 072	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS OCOTLAN DE BETANCOURT - CUATUAMINGO, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+263.71 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	ACALOCOTTIAN OCOTLAN DE BETANCOURT	\$	1,002,223.20	\$	1,002,223.20	\$	1,002,223.20	\$	1,002,223.20	\$	1,002,223.20	\$	1,002,223.20	\$	32.51%	0.00%	500.00 M	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO HA PAGADO ANTIICIPIO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL AREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIICIPIO EN CADA ESTIMACION.
PUE23040 322313	449240	186/23- 073	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA A JILOTEPEC DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 2+676.10 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	LA PALMA	\$	1,033,081.93	\$	1,033,081.93	\$	1,033,081.93	\$	1,033,081.93	\$	1,033,081.93	\$	1,033,081.93	\$	100.00%	0.00%	3664.40 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SU DOCUMENTACION EN REVISION PARA POSTERIOR PAGO POR PARTE DEL AREA CONTABLE
PUE23040 2301898	357319	186/23- 074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAD 0+000.00 AL CAD. 0+166.56 EN LA CALLE LA HERMITA, LOCALIDAD DE TEPEHCAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPEHCAN	\$	1,781,563.33	\$	1,781,563.33	\$	1,781,563.33	\$	1,781,563.33	\$	1,781,563.33	\$	1,781,563.33	\$	0.00%	0.00%	0.00 M	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO HA PAGADO ANTIICIPIO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL AREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIICIPIO EN CADA ESTIMACION, NO SE NOTA UN AVANCE CONSIDERABLE, YA QUE LA OBRA 186/23-077 LA CUAL CORRESPONDE A UNA ELECTRIFICACION SE ESTA EJECUTANDO SOBRE LA MISMA VALIADAD POR LO QUE A ATRASADO LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE LA MISMA
PUE23040 2301729	356579	186/23- 076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COMUNIDAD DE OCOTLA TIZNACANTEPEC, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+916.26, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TIZNACANTEPEC	\$	1,001,632.87	\$	1,001,632.87	\$	1,001,632.87	\$	1,001,632.87	\$	1,001,632.87	\$	1,001,632.87	\$	82.38%	0.00%	600.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO HA PAGADO ANTIICIPIO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL AREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIICIPIO EN CADA ESTIMACION.
PUE23040 301954	357505	186/23- 077	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO AL CERRO, COLONIA PRIMERA SECCION, LOCALIDAD TEPEHCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPEHCAN	\$	861,135.65	\$	861,135.65	\$	861,135.65	\$	861,135.65	\$	861,135.65	\$	861,135.65	\$	36.36%	0.00%	4 PIEZAS	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO HA PAGADO ANTIICIPIO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL AREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIICIPIO EN CADA ESTIMACION.
PUE23040 303381	363862	186/23- 079	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS GOMEZ SUR, CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 5340 M EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ SUR, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	GOMEZ SUR	\$	472,805.08	\$	472,805.08	\$	472,805.08	\$	472,805.08	\$	472,805.08	\$	472,805.08	\$	40.54%	0.00%	50.00 M3	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTIICIPIO
PUE23040 303429	363637	186/23- 080	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EL PROGRESO ELOXOCHITAN, DEL KM 0+000.00 AL KM 8+060.00 EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	EL PROGRESO	\$	1,670,031.96	\$	1,670,031.96	\$	1,670,031.96	\$	1,670,031.96	\$	1,670,031.96	\$	1,670,031.96	\$	32.18%	0.00%	900.00 M3	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTIICIPIO

RECIBIDO  
15 ENE 2024  
SECRETARIA DE BIENESTAR  
SOCIAL Y PROTECCION  
GENERAL DE  
TEPEHCAN, GOBIERNO  
MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**



FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2 303022716 77		186/23-038	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA	LA UNION	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	\$ 1,156,200.06	100.00%	100.00%	246.63 M2	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN
TMP_PUE2 303022716 85		186/23-044	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALACINGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	JALACINGUITO	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,549,999.84	\$ 1,027,232.61	93.26%	66.27%	120.00 m2	OBRA EN PROCESO Y FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 66.27%
TMP_PUE2 304023382 62		186/23-050	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, TLATLAUQUITEPEC, PUE.	TEPETZINTLA	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ 1,589,374.58	\$ -	28.09%	0.00%	50.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LLEVA UN AVANCE DEL 20% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A \$ 476,812.37, EL CUAL NO SE VE REFLEJADO YA QUE YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN
TMP_PUE2 304023383 02		186/23-064	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO SOBRE AVENIDA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA (APORTACION)	TLATLAUQUIT EPEC	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100.00%	100.00%	1 PIEZA	APORTACION REALIZADA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO EL ESTADO SE ENCARGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION POR LO QUE EN META SE COLOCO 1 PIEZA

**15 ENE 2024**  
**RECIBIDO**  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO TRIMESTRE 2023




TLATLAUQUITEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL

TMP_PUE2 304023382 90	186/23- 069	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA)	PEZMATLAN	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 2,503,884.12	\$ 938,461.42	75.00%	37.48%	1200 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO UNA ESTIMACIÓN
Inicio	186/23- 075	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA REFORMA, ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y EPEC	TLATLAUQUIT EPEC	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ 1,498,232.42	\$ -	30.38%	0.00%	200.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y PENDIENTE SU PAGO DE ANTIPOYO YA QUE ESTA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA PAGO
TMP_PUE2 304023382 49	186/23- 078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	TEPANTZOL	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ 1,001,007.12	\$ -	40.00%	0.00%	300.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO EL ANTIPOYO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTIPOYO EN CADA ESTIMACIÓN
TMP_PUE2 304023382 16	186/23- 081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATECTZIN CENTRO, DEL 04000.00 AL 04135.00 DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	COATECTZIN CENTRO	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ 699,636.23	\$ -	0.00%	0.00%	0.00 M2	A ESTE TRIMESTRE LA OBRA NO TIENE UN AVANCE SIGNIFICATIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA EMPRESA RENUNCIÓ AL ANTIPOYO

RECIBIDO  
15 ENE 2024  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Y PROTECCIÓN SOCIAL  
Subsecretaría de Planeación, Seguimiento y  
Evaluación




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD UNICIONABLE	ID. UNICIONABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUJO
2023	4	PUE230402287179	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA.	Puebla	186	Tlatlauquepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura Social	Municipio de Tlatlauquepec	de 293586	40	80	969,301.83	Piezas	30/10/2023	31/12/2023	969,301.83	969,301.83	969,301.83	969,301.83	969,301.83	0.00
2023	4	PUE230402297120	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE IUTA PEZMATLAN DE LA LOCALIDAD DE IUTA Y PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA.	Puebla	186	Tlatlauquepec	Illa	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquepec	de 338424	25	50	1,119,840.60	Metros Cuadrados	17/11/2023	31/12/2023	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	0.00
2023	4	PUE230402301954	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL CERRO COLONIA PRIMERA SECCIÓN LOCALIDAD TEPEHICÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 357505	Puebla	186	Tlatlauquepec	Tepehican	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquepec	de 357505	25	50	861,135.65	Piezas	01/12/2023	31/12/2023	861,135.65	861,135.65	861,135.65	861,135.65	861,135.65	0.00
2023	4	PUE230402251243	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 193.00 KM EN LA LOCALIDAD DE PABLOGO MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 170079	Puebla	186	Tlatlauquepec	Pablogo	Proyecto de Inversión Social	de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquepec	de 170079	50	100	852,469.24	Metros cúbicos	21/07/2023	18/09/2023	852,469.24	852,469.24	852,469.24	852,469.24	852,469.24	0.00
2023	4	PUE230402259460	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ASERADERO A ATALPA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ATALPA PERTENECIENTE A TLATLAUQUETEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 214209	Puebla	186	Tlatlauquepec	Ciudad	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquepec	de 214209	50	100	1,015,819.73	Metros Cuadrados	20/09/2023	28/11/2023	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	0.00
2023	4	PUE230402301729	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE OCOCHA TZINACANTEPEC DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 916.26 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 356579	Puebla	186	Tlatlauquepec	Tzinacantepec	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquepec	de 356579	25	50	1,001,632.87	Metros Cuadrados	06/12/2023	31/12/2023	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	0.00
2023	4	PUE230402301898	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD 0 MAS 000.00 AL CAD. 0 MAS 166.56 EN LA CALLE LA HERMITA LOCALIDAD DE TEPEHICAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 357319	Puebla	186	Tlatlauquepec	Tepehican	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquepec	de 357319	20	40	1,781,563.33	Metros Cuadrados	11/12/2023	31/12/2023	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	0.00
2023	4	PUE230402258479	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN LOCALIDAD DE GÓMEZ SUR MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 214284	Puebla	186	Tlatlauquepec	Gómez Sur	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquepec	de 214284	150	300	1,753,321.47	Piezas	13/09/2023	11/12/2023	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	1,582,825.83
2023	4	PUE230402298576	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA ANTONIO CASO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21D70D18A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC, PUEBLA. - 344165	Puebla	186	Tlatlauquepec	Tepehico Iturbide	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura Social	Municipio de Tlatlauquepec	de 344165	89	178	2,206,349.68	Metros Cuadrados	22/11/2023	31/12/2023	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68
2023	4	PUE230402303381	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EL PROGRESO ELOXOCHITAN DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 8 MAS 060.00 EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 363867	Puebla	186	Tlatlauquepec	Gómez Sur (Llano de Toluca)	Proyecto de Inversión Social	de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquepec	de 363867	20	40	472,805.08	Metros cúbicos	15/12/2023	31/12/2023	472,805.08	472,805.08	472,805.08	472,805.08	472,805.08	0.00
2023	4	PUE230402303429	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EL PROGRESO ELOXOCHITAN DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 8 MAS 060.00 EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 363862	Puebla	186	Tlatlauquepec	El Progreso	Proyecto de Inversión Social	de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquepec	de 363862	25	50	1,670,031.96	Metros cúbicos	15/12/2023	31/12/2023	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	0.00
2023	4	PUE230402286297	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 105 INTERSECCION CON AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE ATIOYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUETEPEC PUEBLA - 289755	Puebla	186	Tlatlauquepec	Atioyan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Vialidades	Municipio de Tlatlauquepec	de 289755	10	20	1,411,000.00	Metros Cuadrados	24/10/2023	31/12/2023	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	0.00

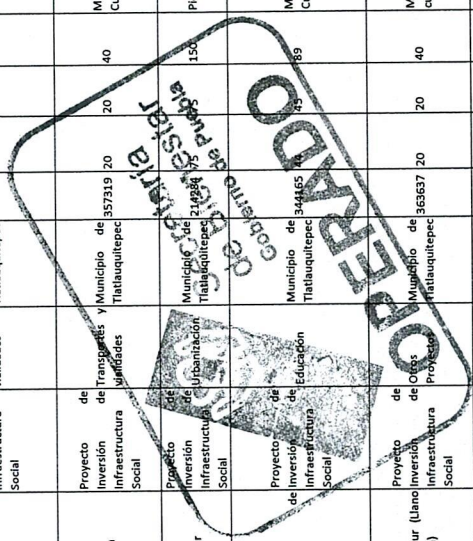

Destino del gasto

Cuarto trimestre 2023


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO_FLUIJO
2023	4	PUE230402295638	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 280.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 332775	186	Tlatlaulquitepec	Cuatlamingo	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 332775 38	37	75	1545	Metros cúbicos	1545	15/11/2023	31/12/2023	999,502.56	999,502.56	999,502.56	999,502.56	999,502.56	0.00
2023	4	PUE230402261241	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, DE ESCUINA CON CALLE PORRINO DIRZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 218.83 EN LA LOCALIDAD DE MATATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 231258	186	Tlatlaulquitepec	Matatepec	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Transportes y Viaductos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 231258 50	50	100	1618.68	Metros Cuadrados	1618.68	01/09/2023	15/12/2023	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	0.00
2023	4	PUE230402248349	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL ZOPILCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESCUINA JOSEFA ORTIZ DE TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 153745	186	Tlatlaulquitepec	Ciudad Tlatlaulquitepec	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Urbanización	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 153745 4524	4523	9047	4	Piezas	4	21/07/2023	08/09/2023	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	0.00	0.00
2023	4	PUE230402287093	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 160.00 EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 293198	186	Tlatlaulquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Transportes y Viaductos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 293198 38	37	75	828	Metros Cuadrados	828	01/11/2023	31/12/2023	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	682,470.44
2023	4	PUE230402256455	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y C.C.T. 21DT0V01235 EN LA COMUNIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 214187	186	Tlatlaulquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Educación	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 214187 77	77	154	693	Metros Cuadrados	693	13/09/2023	11/12/2023	2,333,254.19	2,333,254.19	2,333,254.19	2,333,254.19	2,333,254.19	1,212,871.51
2023	4	PUE230402289930	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE TEPEHICAN HUAXTLA DEL KM 0 MAS 307.00 AL 0 MAS 507.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 307472	186	Tlatlaulquitepec	Huaxtla	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Transportes y Viaductos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 307472 25	25	50	950	Metros Cuadrados	950	07/11/2023	31/12/2023	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	0.00
2023	4	PUE230402301773	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT CUAUTLAMINGO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 253.71 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 356792	186	Tlatlaulquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 356792 30	30	60	1538.1	Metros cúbicos	1538.1	04/12/2023	31/12/2023	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	0.00
2023	4	PUE230402322313	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA A HILOTEPEC DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 676.10 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 449240	186	Tlatlaulquitepec	La Palma (Máquinas)	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 449240 20	20	40	3664.4	Metros Cuadrados	3664.4	08/12/2023	31/12/2023	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	0.00
2023	4	PUE230402228586	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL BACHILLERATO MEXICO 68 CON CLAVE DE OCOTLAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 112303	186	Tlatlaulquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Educación	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 112303 160	160	120	587.18	Metros Cuadrados	587.18	20/06/2023	18/09/2023	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	0.00
2023	4	PUE230402228844	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 00.00 AL 0 MAS 120.00 DEL KM 0 MAS 35.50 AL 0 MAS 165.50 Y DEL KM 0 MAS 347 AL 0 MAS 397 EN LA LOCALIDAD DE CUICUALXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114026	186	Tlatlaulquitepec	Cuicualxtlá	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Transportes y Viaductos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 114026 70	70	140	880	Metros Cuadrados	880	20/06/2023	18/09/2023	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	1,013,879.46
2023	4	PUE230402251292	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEODORO MENEZ XOPANICO EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170960	186	Tlatlaulquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura de Transportes y Viaductos	Municipio de Tlatlaulquitepec	de 170960 108	107	215	840	Metros Cuadrados	840	02/08/2023	08/09/2023	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	0.00

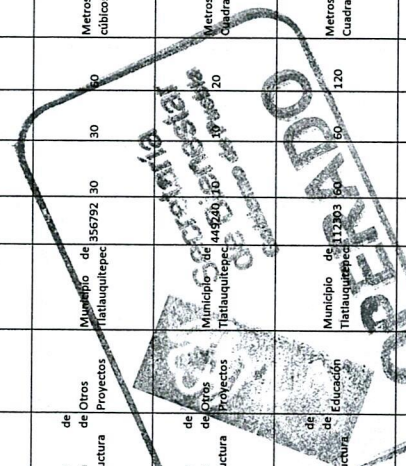


## Destino del gasto

## Cuarto trimestre 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O PROYECTO	HOMBR ES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUJO	
2023	4	PUE230302248305	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN ERERO DE TEJADA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLÁN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 153474	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	153474_35	35	70	Metros lineales	189	21/07/2023	04/09/2023	240,422.93	240,422.93	240,422.93	240,422.93	240,422.93	240,422.93	Validado avances
2023	4	PUE230302248421	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000 AL O MAS 165.00 EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154204	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ajocotzingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154204_55	55	110	Metros Cuadrados	834.6	21/07/2023	15/09/2023	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	Validado avances
2023	4	PUE230302248450	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUNCO TOCHIMPA DE 260 M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE XACUNCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 167230	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tochimpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154312_255	255	510	Metros Cuadrados	590.5	21/07/2023	09/10/2023	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	Validado avances
2023	4	PUE230302250667	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZAPATA CALLE HERNÁNDEZ CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCULIAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 167230	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tzincuilpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	167230_43	42	85	Piezas	19	30/07/2023	14/11/2023	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	Validado avances
2023	4	PUE230302257907	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 211273	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	111273_67	68	135	Kilómetro	2350	01/09/2023	20/10/2023	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	Validado avances
2023	4	PUE230302257933	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUACCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 250 M DE LONGITUD DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 0 MAS 250.00 - 211375	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tehuacco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	211375_60	60	120	Metros Cuadrados	1250	01/09/2023	29/11/2023	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	Validado avances
2023	4	PUE230302262142	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 236020	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	236020_59	59	118	Metros Cuadrados	900	20/09/2023	17/11/2023	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	Validado avances
2023	4	PUE23040226989	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GUILLERMO PRIETO ENTRE EL LIBERTADORES MIGUEL GUERRERO ORTIZ Y CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 092.31 EN LA LOCALIDAD DE ANÁLCO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 290589	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Mecoyucan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	290589_13	12	25	Metros Cuadrados	579.15	01/09/2023	29/11/2023	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	Validado avances
2023	4	PUE230302258464	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 6 MAS 600.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 214217	Puebla	186	Tlatlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	214217_50	50	100	Metros cúbicos	955.29	20/09/2023	18/12/2023	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	Validado avances
2023	4	PUE230302251362	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO QUETZALCÓTL CON CLAVE Z1EBH007P DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170849	Puebla	186	Tlatlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	170849_89	88	177	Metros Cuadrados	551.32	25/07/2023	23/10/2023	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	Validado avances




CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FLUIJO		
2023	4	PUE230302251445	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CON CLAVE 21DRP3530 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 171321	186	Tlatlaauquitepec	Xonocuatla	Proyecto de Inversión Social	de Educación	Municipio de Tlatlaauquitepec	171321	132	264	Metros Cuadrados	614.81	25/07/2023	07/10/2023	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	Validado avances
2023	4	PUE230302248484	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN DE TURBIDE EN LA COMUNIDAD DE XALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154507	186	Tlatlaauquitepec	Xaltenango	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaauquitepec	154507	50	100	Metros Cuadrados	825	21/07/2023	15/09/2023	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	Validado avances
2023	4	PUE230302233720	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS AL O MAS 180.00 EN LA LOCALIDAD DE TANHUICO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 183731	186	Tlatlaauquitepec	Tanhuiuco Carmen	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaauquitepec	183731	48	95	Metros Cuadrados	1080	09/08/2023	18/09/2023	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	Validado avances
2023	4	PUE230402338216	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATECTZIN CENTRO, DEL 0+000.00 AL 0+135.00 DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	186	Tlatlaauquitepec	Coactectzin Centro	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-081	0	176	Metros Cuadrados	503.1	26/12/2023	05/03/2024	699,636.23	699,636.23	699,636.23	699,636.23	699,636.23	0.00	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402338276	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA REFORMA, ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE LIC. EDUARDO GUERRA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	186	Tlatlaauquitepec	Ciudad Tlatlaauquitepec	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-075	0	4679	Metros Cuadrados	658.36	29/11/2023	07/03/2024	1,498,232.42	1,498,232.42	1,498,232.42	1,498,232.42	1,498,232.42	0.00	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230302271685	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALCARGUICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	186	Tlatlaauquitepec	Ciudad Tlatlaauquitepec	Proyecto de Inversión Social	de Asistencia Social	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-044	0	128	Metros Cuadrados	246.63	20/09/2023	18/12/2023	1,549,999.84	1,549,999.84	1,549,999.84	1,549,999.84	1,549,999.84	1,549,999.84	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402338249	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE TEPANTZOL, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	186	Tlatlaauquitepec	Tepantzol	Proyecto de Inversión Económica	de Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-049	0	100	Metros Cuadrados	750	11/12/2023	09/02/2024	1,001,007.12	1,001,007.12	1,001,007.12	1,001,007.12	1,001,007.12	0.00	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402338262	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, TLATLAUQUITEPEC, PUE.	186	Tlatlaauquitepec	Tepetzintla	Proyecto de Inversión Social	de Cultura y turismo	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-050	0	188	Metros Cuadrados	178	01/11/2023	28/02/2024	1,589,374.58	1,589,374.58	1,589,374.58	1,589,374.58	1,589,374.58	0.00	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402338290	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC. (SEGUNDA ETAPA)	186	Tlatlaauquitepec	Ciudad Tlatlaauquitepec	Proyecto de Inversión Económica	de Cultura y turismo	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-068	0	4679	Metros Cuadrados	1600	06/10/2023	04/02/2024	2,503,884.12	2,503,884.12	2,503,884.12	2,503,884.12	2,503,884.12	938,461,42	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE23030221677	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EPLANADA Y MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA	186	Tlatlaauquitepec	La Unión	Proyecto de Inversión Social	de Asistencia Social	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-064	0	51495	Metros Cuadrados	246.63	15/09/2023	13/12/2023	1,156,200.06	1,156,200.06	1,156,200.06	1,156,200.06	1,156,200.06	1,156,200.06	Validado avances
2023	4	PUE230402338302	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO SOBRE AVENIDA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA (APORTACION)	186	Tlatlaauquitepec	Ciudad Tlatlaauquitepec	Proyecto de Inversión Gubernamental	de Seguridad	Municipio de Tlatlaauquitepec	186/23-064	0	9358	Piezas	1	01/10/2023	31/12/2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado / Registrado avances

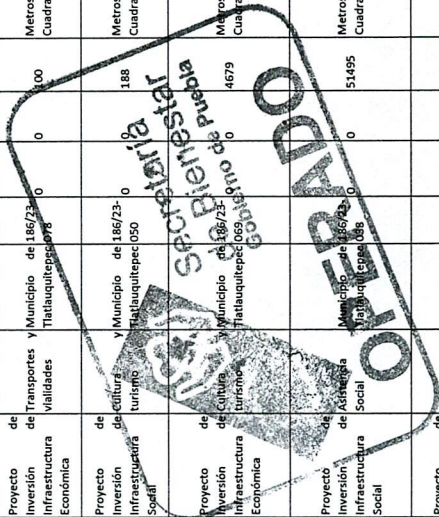


Ejercicio del gasto

TIPO_REGISTRO	CICLO	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENT	ID_MUNICIPIO	CICLO_REC	ID_RAMO	ID_MODALIDAD	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FONDO	INSTITUCION	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GEN	DESC_PARTIDA_GEN	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS			
1-Programa presupuestario	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec	1,638,822.20	0	Gasto Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	0.00	0.00	Trabajos en acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción y rehabilitación de parques públicos)	Validado			
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	622	Edificación no habitacional	2,635,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (construcción de centro cultural)	Validado			
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto corriente	531	Equipo médico y de laboratorio ( cámara multisensorial y material ortopédico)	2,321,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo médico y de laboratorio ( cámara multisensorial y material ortopédico)	Validado		
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ayudas sociales a personas (VIENDA)	Validado	
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	4,595,836.09	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	13,358,174.86	7,328,060.89	7,328,060.89	Construcción de vías de comunicación (Construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras y terracerías)	Validado		
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4,128,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (rehabilitación y construcción de parques)	Validado	
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	14,551,169.12	11,234,436.83	11,234,436.83	Construcción De Techo En Area De Impartición De Educación Física	Validado		
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	612	Edificación no habitacional	13,306,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Edificación no habitacional (Infraestructura cultural y educativa: construcción de aulas, dirección y módulos, techados en fresas de impartición de educación física, canchas, espacios perimetrales, salones de usos múltiples, salones de centros comunitarios, rehabilitación y construcción de parques)	Validado
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación de energía eléctrica, agua potable y drenaje)	17,560,797.90	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	6,395,419.95	4,394,486.83	4,394,486.83	Construcción de obras para el abastecimiento de agua y construcción de obras para la generación de energía eléctrica, agua potable y drenaje)	Validado		
2-Partida genérica	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec			Gasto Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	24,763,687.88	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	38,593,366.10	28,496,685.08	28,496,685.08	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Construcción de obras para la dotación de servicios tales como: cuanaciones, banquetas, pavimentos en vías del municipio)	Validado		
1-Programa presupuestario	2023	Puebla	21	186	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	APORTACIONES FAIS (APORTACIONES FAIS, SUBSIDIOS Y MUNICIPAL CONVENIOS)	Municipio de Tlaxauquitepec	375,289.07	0	Gasto Inversión												Validado		

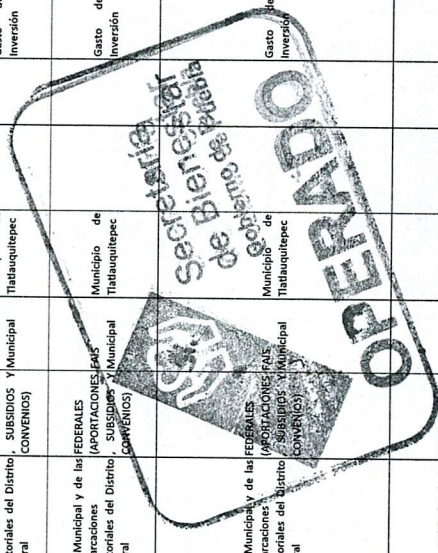

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENT_FEDERATIVA	ID_ENT_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECURSIVO	ID_RAMO	ID_MODALIDAD	ID_PPROGRAMA_ESTADISTABIO	TIPO_RECURSO	PROG_FONDOS	INSTITUCION_EJECUTORA	RENTGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	272	1,000,000.00	931,851.20	931,851.20	931,851.20	931,851.20	931,851.20	0.00	Prendas de seguridad y protección personal	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	311	9,000,000.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	7,829,331.00	0.00	Energía eléctrica (pago de alumbrado público)	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	132	912,670.71	1,278,982.63	1,278,982.63	1,278,982.63	1,278,982.63	0.00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	113	5,675,982.88	8,129,490.89	8,129,490.89	8,129,490.89	8,129,490.89	5,860,495.91	Sueldos base al personal permanente (sueldos de elementos de seguridad pública)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	853	2,466,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	4,966,857.40	0.00	Otros convenios (aportación al censo)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	555	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de comunicación y telecomunicación	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	523	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cámaras fotográficas y de video ( adquisición y colocación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del municipio)	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto Inversión	541	5,672,573.96	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	2,759,900.00	0.00	Vehículos y Equipo Terrestre (adquisición de vehículos y equipamiento para servicio público municipal)	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	449	8,611,653.64	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	7,969,980.88	0.00	Ayudas sociales a personas (calentadores solares, estufas ecológicas, colectores pluviales, linacos, etc.)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	392	246,701.00	115,028.00	115,028.00	115,028.00	115,028.00	0.00	Impuestos y derechos (CONAGUA)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto corriente	358	2,200,000.00	2,162,610.45	2,162,610.45	2,162,610.45	2,162,610.45	0.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos (pago por confinamiento de relleno sanitario)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto Inversión	622	4,000,000.00	8,169,528.85	8,169,528.85	8,169,528.85	8,169,528.85	0.00	Edificación no habitacional (rehabilitación de espacios para el desarrollo comunitario)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto Inversión	629	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (construcción de salos de usos múltiples y techados comunitarios)	Validado
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Municipio de Tlaltlauquitepec	Gasto Inversión	581	1,500,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	Terrenos (adquisición de predios)	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	CICLO_RECORSIVO	ID_FISCAL	RAMO	ID_MODALIDAD	ID_PROGRAMA Presupuestario	TIPO_RECORSIVO	PROCESO	INSTITUCION Ejecutora	RENTAMIENTO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)	1,000,000.00	3,198,875.77	3,198,875.77	3,198,875.77	3,198,875.77	0.00		División de terrenos y construcción de obras de urbanización (construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y pavimentos, adoquines)	Validado	
2-Partida genérica	2023	4	21	Puebla	186	Tlaxiahuac	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	Municipio de Tlaxiahuac		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	3,050,728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Construcción de vías de comunicación (Rehabilitación de caminos)	Validado



Indicadores

Cuarto trimestre 2023

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.92308	1.92308	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	0	N/D	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	36.53846	36.53846		42.85714		117.29	Validado
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	61.53846	61.53846	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	57.14286	107.69	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.86583	2.86583	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	24224	1182.23	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	100	100	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Componente	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	.01262	.01262	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	5.48221	43440.65	Validado		
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	100	100	Validado	
2023	4	4	Puebla	Tlaxiahuacpec 33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	{Just1:(ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:gilbertodsa nchez,fecha:11/01/24)}	100	100	Validado	

