

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 21-2124/010

OMBRE: REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI
DESCRIPCIÓN: VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNI
CIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MTP/TM/2021-11/006
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN: TLATLAUQUITEPEC
FECHA DE INICIO: 03 DIC 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 FEB 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 21-2124/010
MONTO ORIGINAL: \$2,212,860.15
FECHA DE FIRMA: 03 DIC 2021
FECHA VENCE: 01 FEB 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VERONICA ROSAS LOPEZ
DOMICILIO: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 46 No. Interior: B
Colonia: C. P.: 72900
Municipio: TLATLAUQUITEPEC Entidad Fed.: PUEBLA
TELEFONO: 2226992346
R. F. C.: ROLV921026SV3
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,212,860.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3238-15126-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 02 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$221,286.02

FIANZA ANTICIPO: 3238-15125-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 02 DIC 2021
MONTO FIANZA: \$663,858.05

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3238-15261-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 01 FEB 2022
MONTO FIANZA: \$221,286.02



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	2,212,860.15
TOTAL ASIGNADO:		2,212,860.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE CON REMOVE	4.530	100,259.72	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		100,259.72	0.00		
002	DESMONTAJE DE LÁMINA ACRÍLICA, HASTA UN	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.040	789.76	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		789.76	0.00		
004	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.021	460.18	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		460.18	0.00		
005	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLU	0.127	2,807.20	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,807.20	0.00		
006	DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA	0.092	2,043.54	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,043.54	0.00		
007	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE	0.202	4,464.43	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,464.43	0.00		
008	RETIRO DE BARANDAL METALICO EXISTENTE IN	0.106	2,354.67	2,174.32	92.341	92.341
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,354.67	2,174.32		
009	RETIRO DE TEJA EXISTENTE SOBRE LOSAS, T	1.949	43,126.09	20,407.14	47.320	47.320
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		43,126.09	20,407.14		
010	DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA,	0.360	7,967.38	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,967.38	0.00		
011	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPES	0.049	1,088.40	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		1,088.40	0.00		
012	TRATAMIENTO PRESERVADOR DE MADERA IN SI	1.553	34,373.31	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		34,373.31	0.00		
013	SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA PRE	13.514	299,053.80	182,382.95	60.987	60.987
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		299,053.80	182,382.95		
014	COLOCACION DE TEJA DE BARRO RECUPERADA	5.192	114,086.52	35,619.40	31.004	31.004
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		114,086.52	35,619.40		
015	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DE	0.333	7,360.14	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,360.14	0.00		
016	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DE	0.322	7,135.51	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,135.51	0.00		
017	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-	0.813	17,990.21	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		17,990.21	0.00		
018	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO	0.334	7,384.39	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,384.39	0.00		
019	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 C	0.210	4,831.97	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,831.97	0.00		
020	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIM	0.093	2,065.43	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,065.43	0.00		
021	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBR	0.103	2,277.05	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,277.05	0.00		
022	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X	0.546	12,090.24	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		12,090.24	0.00		
023	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10	0.200	4,430.98	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,430.98	0.00		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO	0.055	1,210.48	1,210.48	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		1,210.48	1,210.48		
025	PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE	1.056	23,367.71	15,578.47	66.667	66.667
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		23,367.71	15,578.47		
026	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CO	0.219	4,851.64	4,851.64	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,851.64	4,851.64		
027	SUMINISTRO Y COLOCACION, PUERTA DE HERR	0.164	3,620.06	3,620.06	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,620.06	3,620.06		
028	CHAPA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON MAND	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
029	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA CON	0.055	1,220.31	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		1,220.31	0.00		
030	TRATAMIENTO IN SITU DE ELEMENTOS A BASE	0.991	21,939.94	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		21,939.94	0.00		
031	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLU	11.669	258,216.20	258,216.20	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		258,216.20	258,216.20		
032	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESA	0.221	4,898.95	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,898.95	0.00		
033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 1	0.513	11,356.49	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		11,356.49	0.00		
034	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APAREN	0.183	4,059.70	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,059.70	0.00		
035	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO	0.352	7,792.42	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		7,792.42	0.00		
036	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	0.551	12,202.53	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		12,202.53	0.00		
037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO	0.050	1,103.58	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		1,103.58	0.00		
038	ELABORACION DE CARCAMO PARA BOMBEO DE A	0.401	8,879.80	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		8,879.80	0.00		
039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERG	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTE	13.086	289,577.23	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		289,577.23	0.00		
041	FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO	0.730	16,163.82	11,608.51	71.818	71.818
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		16,163.82	11,608.51		
042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE 1.0	2.445	54,100.27	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		54,100.27	0.00		
043	S Y C DE MACETAS DE ACERO INOXIDABLE DE	1.602	35,453.61	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		35,453.61	0.00		
044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSE	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
045	S Y C DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAM	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE COCIN	1.237	27,364.17	27,364.17	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		27,364.17	27,364.17		
047	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION . DE WC JU	1.746	38,637.74	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		38,637.74	0.00		
048	S Y C. DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUI	0.165	3,656.74	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,656.74	0.00		
049	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO	0.174	3,849.20	3,849.20	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,849.20	3,849.20		
050	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE L	0.982	21,722.72	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		21,722.72	0.00		
051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO E	1.616	35,762.52	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		35,762.52	0.00		
052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA	0.454	10,048.85	10,048.85	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		10,048.85	10,048.85		
053	SUM. FABRICACION Y COLOC. DE PUERTA PARA	0.657	14,542.13	14,542.13	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		14,542.13	14,542.13		
054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LE	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
055	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON C	3.607	79,822.81	0.00	0.000	0.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		79,822.81	0.00		
056	SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA CON RESPA	1.337	29,594.62	0.00	0.000	0.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		29,594.62	0.00		
057	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC	0.985	21,804.46	21,804.46	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		21,804.46	21,804.46		
058	LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL COLGANTE	0.506	11,194.00	11,194.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		11,194.00	11,194.00		
059	LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL MODELO FTL	0.878	19,418.40	19,418.40	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		19,418.40	19,418.40		
060	LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL MODELO 650	1.453	32,155.20	32,155.20	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		32,155.20	32,155.20		
061	LAMPARA VINTAGE INDUSTRIAL SCONCE 3 FOC	0.204	4,524.00	4,524.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		4,524.00	4,524.00		
062	LÁMPARA DE PARED TIPO FAROL DE EXTERIOR	0.262	5,800.00	5,800.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		5,800.00	5,800.00		
063	LÁMPARA DE PARED TIPO FAROL DE EXTERIOR	0.131	2,900.00	2,900.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,900.00	2,900.00		
064	CANCELERIA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO	0.752	16,638.34	16,638.34	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		16,638.34	16,638.34		
065	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL A BA	1.046	23,141.69	23,141.69	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		23,141.69	23,141.69		
066	LIMPIEZA DE PIEDRA O SUPERFICIE RUGOSA	1.394	30,838.02	30,838.02	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		30,838.02	30,838.02		
067	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	2.455	54,325.94	54,325.94	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		54,325.94	54,325.94		
068	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENT	0.993	21,965.41	21,965.41	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		21,965.41	21,965.41		
069	SUMINISTRO Y COLOCACION POR SUSTITUCION	2.988	66,120.00	66,120.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		66,120.00	66,120.00		
070	CIMBRA P/LOSAS (ZARZO) CON TABLA ACAB	3.231	71,502.40	71,502.40	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		71,502.40	71,502.40		
071	DEMOLICIÓN DE LOSA A BASE DE ESTRUCTURA	0.735	16,265.91	16,265.91	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		16,265.91	16,265.91		
072	DESMONTAJE DE PISO DE DUELA, INCLUYE RE	0.678	14,999.50	14,999.50	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		14,999.50	14,999.50		
073	MM-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO	0.236	5,220.00	5,220.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		5,220.00	5,220.00		
074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE MA	0.149	3,306.00	3,306.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,306.00	3,306.00		
075	RETIRO DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12	0.057	1,255.82	1,255.82	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		1,255.82	1,255.82		
076	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MA	0.126	2,784.00	2,784.00	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		2,784.00	2,784.00		
077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERG	0.249	5,501.02	5,501.02	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		5,501.02	5,501.02		
078	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE	1.763	39,014.98	39,014.98	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		39,014.98	39,014.98		
079	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE	1.273	28,167.70	28,167.70	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		28,167.70	28,167.70		
080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE	0.146	3,239.88	3,239.88	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		3,239.88	3,239.88		
081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA L	0.295	6,520.32	6,520.32	100.000	100.000
5.03	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM		6,520.32	6,520.32		

TOTAL 100.000 2,212,860.15 1,100,076.51 49.713 49.714

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVI	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	49.714	50.286	100.000
FINANCIERO:	1,100,076.51 49.713	1,112,783.64 50.287	2,212,860.15 100.000



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
RFC: MTP930215QP7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS


01 FEB 2022: REPORTE NO. 02
ESTIMACION 2 FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO A
01 DE FEBRERO DEE 2022



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,112,783.64	0.00	1,112,783.64
01 FEB 2022 D02MVC0023	1.2.3.6.1.2	2,174.32		1,114,957.96
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN ESTIMACION 2 FINIQUITO			
Requisición:	01MVC00032			
Concepto:	008			
Fuente financ.:	RETIRO DE BARANDAL METALICO EXISTENTE EN 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)			
Componente:	01			
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO			
Actividad:	10			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
C.O.G.:	6.2.1.2			
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			
Ficha por pagar:	202201MVC00032			
Acreedor:	0001421			
	VERONICA ROSAS LOPEZ			
Contrato:	21-2124/010			
01 FEB 2022 D02MVC0023	1.2.3.6.1.2	20,407.14		1,135,365.10
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MVC00032			
Requisición:	009			
Concepto:	RETIRO DE TEJA EXISTENTE SOBRE LOSAS, T			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)			
Unidad admin.:	03			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	4102			
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)			



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO	
Actividad:	10		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.2.1.2		
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	182,382.95	1,317,748.05
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	
		MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN	
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	013		
		SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA PRE	
Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DE) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4102		
		FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO	
Actividad:	10		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.2.1.2		
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	35,619.40	1,353,367.45
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	
		MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN	
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	014		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Fuente financ.: COLOCACION DE TEJA DE BARRO RECUPERADA
 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 1.2.3.6.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032

Requisición:
 Concepto: 024
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES


C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

01 FEB 2022 D02MCV0023

1,210.48

1,354,577.93



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI


Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	15,578.47	1,370,156.40
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	025		
Fuente financ.:	PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE 5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreeedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	4,851.64	1,375,008.04
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	026		
Fuente financ.:	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CO 5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 Función: ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO
 271
 C.O.G.: OTROS ASUNTOS SOCIALES
 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ
 Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 3,620.06 1,378,628.10

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032


Requisición: 027
 Concepto: SUMINISTRO Y COLOCACION, PUERTA DE HERR
 Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ
 Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 258,216.20 1,636,844.30

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032

Requisición: 031
 Concepto: PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLU
 Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

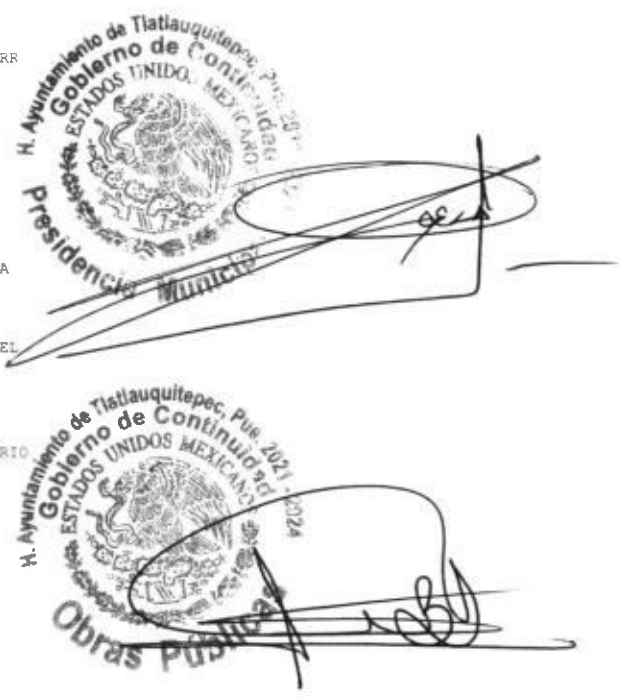


MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4102		
Actividad:	FORTEALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Ficha por pagar:	10		
Acreeedor:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Contrato:	271		
01 FEB 2022 D02MCO023	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	202201MCO0032		
	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
	21-2124/010		
	1.2.3.6.1.2	11,608.51	1,648,452.81
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MCO0032		
Requisición:	041		
Concepto:	FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4102		
Actividad:	FORTEALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Ficha por pagar:	10		
Acreeedor:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Contrato:	271		
01 FEB 2022 D02MCO023	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	202201MCO0032		
	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
	21-2124/010		
	1.2.3.6.1.2	27,364.17	1,675,816.96
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		




MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI


MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 IVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN

Requisición: 01MCV00032
 Concepto: 046
 Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO
 Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ
 Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2



3,849.20 1,679,666.18

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 IVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032
 Requisición: 01MCV00032
 Concepto: 049
 S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO
 Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)
 Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO
 Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO
 Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES
 C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



[Handwritten signature]

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ
 Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 10,048.85 1,689,715.03

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032

Requisición:
 Concepto: 052
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA
 Fuente financ.: 5.03

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03

OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 14,542.13 1,704,257.16

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032

Requisición:
 Concepto: 053
 SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA
 Fuente financ.: 5.03

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)
 Unidad admin.: 03

OBRA PUBLICA
 Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)



[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



[Handwritten signature]

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO	
Actividad:	10 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO	
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.2.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	
Ficha por pagar:	202201MCV00032	
Acreedor:	0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	21-2124/010	
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	21,804.46 1,726,061.62
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MCV00032	
Requisición:	057	
Concepto:	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC 5.03	
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03 OBRA PUBLICA	
Programa:	4102 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)	
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO	
Actividad:	10 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO	
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.2.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	
Ficha por pagar:	202201MCV00032	
Acreedor:	0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	21-2124/010	
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	11,194.00 1,737,255.62
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MCV00032	
Requisición:	058	
Concepto:		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2

19,418.40

1,756,674.02

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032

Requisición: 01MCV00032
 Concepto: 059
 LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL MODELO FTL

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)



Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES


Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01 FEB 2022	D02MCO023	Contrato: 21-2124/010 1.2.3.6.1.2	32,155.20	1,788,829.22
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO		
		Requisición: Concepto: 01MCO0032 060		
		LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL MODELO 650		
		Fuente financ.: 5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
		Unidad admin.: 03		
		OBRA PUBLICA		
		Programa: 4102		
		FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
		Componente: 01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
		Actividad: 10		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		
		Función: 271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
		C.O.G.: 6.2.1.2		
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
		Ficha por pagar: 202201MCO0032		
		Acreedor: 0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ		
01 FEB 2022	D02MCO023	Contrato: 21-2124/010 1.2.3.6.1.2	4,524.00	1,793,353.22
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO		
		Requisición: Concepto: 01MCO0032 061		
		LAMPARA VINTAGE INDUSTRIAL SCONCE 3 FOC		
		Fuente financ.: 5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
		Unidad admin.: 03		
		OBRA PUBLICA		
		Programa: 4102		
		FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
		Componente: 01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
		Actividad: 10		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



[Handwritten signature]

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI			
	ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	5,800.00	1,799,153.22
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	062		
	LÁMPARA DE PARED TIPO FAROL DE EXTERIOR		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	2,900.00	1,802,053.22
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	063		
	LÁMPARA DE PARED TIPO FAROL DE EXTERIOR		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA		
Componente:	4102		
Actividad:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Función:	01		
C.O.G.:	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Ficha por pagar:	10		
Acreeedor:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Contrato:	271		
01 FEB 2022 D02MVC0023	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	202201MVC00032		
	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
	21-2124/010		
	1.2.3.6.1.2	16,638.34	1,818,691.56
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI IVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MVC00032		
Requisición:	064		
Concepto:	CANCELERIA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO		
Fuente financ.:	5.03		
Unidad admin.:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Programa:	03		
Componente:	OBRA PUBLICA		
Actividad:	4102		
Función:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
C.O.G.:	01		
Ficha por pagar:	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Acreeedor:	10		
Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
01 FEB 2022 D02MVC0023	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	202201MVC00032		
	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
	21-2124/010		
	1.2.3.6.1.2	23,141.69	1,841,833.25
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



[Handwritten signature]

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 IVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN

Requisición: 01MCV00032
 Concepto: 065
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCEL A BA

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2

30,838.02 1,872,671.27

Requisición: MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 Concepto: 066
 LIMPIEZA DE PIEDRA O SUPERFICIE RUGOSA

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y



[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



	OBRA/ACCIÓN	No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI		
		REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	Ficha por pagar:	202201MCV00032		
	Acreedor:	0001421		
	Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022	D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	54,325.94	1,926,997.21
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	Requisición:	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
	Concepto:	01MCV00032		
	Fuente financ.:	067		
	Unidad admin.:	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE		
	Programa:	5.03		
	Componente:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
	Actividad:	03		
	Función:	OBRA PUBLICA		
	C.O.G.:	4102		
	Ficha por pagar:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
	Acreedor:	01		
	Contrato:	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
	Concepto:	10		
	Fuente financ.:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
	Unidad admin.:	271		
	Programa:	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Componente:	6.2.1.2		
	Actividad:	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	Función:	202201MCV00032		
	C.O.G.:	0001421		
	Ficha por pagar:	VERONICA ROSAS LOPEZ		
	Acreedor:	21-2124/010		
	Contrato:	1.2.3.6.1.2		
01 FEB 2022	D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	21,965.41	1,948,962.62
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	Requisición:	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
	Concepto:	01MCV00032		
	Fuente financ.:	068		
	Unidad admin.:	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENT		
	Programa:	5.03		
	Componente:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
	Actividad:	03		
	Función:	OBRA PUBLICA		
	C.O.G.:	4102		
	Ficha por pagar:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
	Acreedor:			
	Contrato:			
	Concepto:			
	Fuente financ.:			
	Unidad admin.:			
	Programa:			
	Componente:			
	Actividad:			
	Función:			
	C.O.G.:			

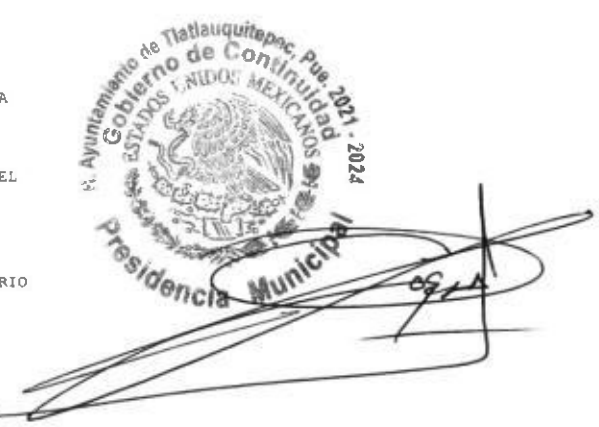

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 66,120.00 2,015,062.62

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MCV00032

Requisición: 069
 Concepto: SUMINISTRO Y COLOCACION POR SUSTITUCION

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)



Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO


Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 71,502.40 2,086,565.02



MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MCV00032

Requisición: 070
 Concepto:

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Fuente financ.: CIMBRA P/LOSAS (ZARZO) CON TABLA ACAB
 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MVC0023 1.2.3.6.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES
 MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO
 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI
 VOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN
 01MCV00032

Requisición: 071
 Concepto: DEMOLICIÓN DE LOSA A BASE DE ESTRUCTURA

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL
 RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
 ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 17,265.91 2,102,950.93





[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	14,999.50	2,117,850.43
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	072		
	DESMONTAJE DE PISO DE DUELA, INCLUYE RE		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	5,220.00	2,123,070.43
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	073		
	MM-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO





	OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI		
	ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	3,306.00	2,126,376.43
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	074		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE MA		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DE RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	1,255.82	2,127,632.25
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	075		
	RETIRO DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO





OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI			
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA 4102 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	2,784.00	2,130,416.25
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI IVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN 01MCV00032		
Requisición:	076		
Concepto:	SUMINISTRO E ISNTALACION DE VIGA DE MA 5.03		
Fuente financ.:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
Programa:	OBRA PUBLICA 4102 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreedor:	0001421 VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	5,501.02	2,135,917.27
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	077		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERG		
	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreeedor:	0001421		
	VERONICA ROSAS LOPEZ		
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	39,014.96	2,174,932.25
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		
	MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN		
Requisición:	01MCV00032		
Concepto:	078		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE		
	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)		
Unidad admin.:	03		
	OBRA PUBLICA		
Programa:	4102		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)		
Componente:	01		
	PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO		
Actividad:	10		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
C.O.G.:	6.2.1.2		
	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y		



MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO



OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 28,167.70 2,203,099.95

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN

Requisición: 01MCV00032
 Concepto: 079
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)

Componente: 01
 PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL RECURSO FORTAMUN APLICADO

Actividad: 10
 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

Función: 271
 OTROS ASUNTOS SOCIALES

C.O.G.: 6.2.1.2
 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES

Ficha por pagar: 202201MCV00032
 Acreedor: 0001421
 VERONICA ROSAS LOPEZ

Contrato: 21-2124/010
 01 FEB 2022 D02MCV0023 1.2.3.6.1.2 3,239.88 2,206,339.83

MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES HABITACIONALES


MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN

Requisición: 01MCV00032
 Concepto: 080
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSE

Fuente financ.: 5.03
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) (ETIQ)

Unidad admin.: 03
 OBRA PUBLICA

Programa: 4102
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA (FORTAMUN)

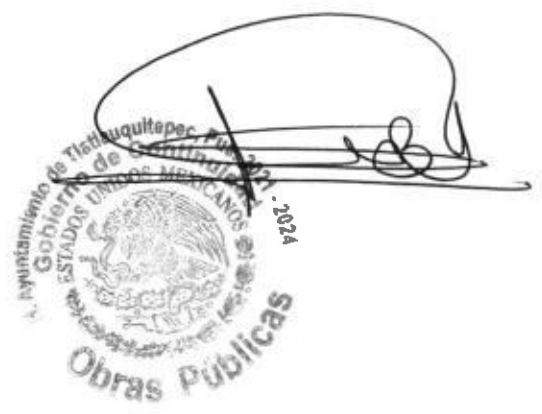

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
 RFC: MTP930215QP7
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

OBRA/ACCIÓN No. 21-2124/010 REHABILITACION DE SERVICIOS ADMINISTRATI

Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL	
		RECURSO FORTAMUN APLICADO	
Actividad:	10		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN	
		ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.2.1.2		
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y	
		REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES	
		HABITACIONALES	
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreeedor:	0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	21-2124/010		
01 FEB 2022 D02MCV0023	1.2.3.6.1.2	6,520.32	2,212,860.15
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y	
		REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES	
		HABITACIONALES	
		MTP-21-2124/010 ESTIMACION 2 FINIQUITO	
		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATI	
		IVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUN	
		01MCV00032	
Requisición:			
Concepto:	081		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA L	
Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	
		(FORTAMUN DF) (ETIQ)	
Unidad admin.:	03		
		OBRA PUBLICA	
Programa:	4102		
		FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	
		(FORTAMUN)	
Componente:	01		
		PLANEACION ESTRATEGICA DE EJECUCION DEL	
		RECURSO FORTAMUN APLICADO	
Actividad:	10		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN	
		ESPACIOS PARA EL DESARRROLLO COMUNITARIO	
Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES	
C.O.G.:	6.2.1.2		
		MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y	
		REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES	
		HABITACIONALES	
Ficha por pagar:	202201MCV00032		
Acreeedor:	0001421		
		VERONICA ROSAS LOPEZ	
Contrato:	21-2124/010		
SUMA PERIODO:.....		1,100,076.51	0.00 1,100,076.51
SALDO FINAL:.....		2,212,860.15	0.00 2,212,860.15

